

管理棟2F放送室 照明制御盤

管理棟2F更衣室 L-2電灯分電盤

夜間照明制御盤位置図

工事名称	令和4年度厚木市立玉川野球場及び市内小学校校舎等の施設改修工事(体育施設等)	作成年月日	令和4.5.10	図面番号	1
図面名称	夜間照明制御盤図 (玉川野球場)	縮尺	-	有会社	住田電気工事
					神奈川県厚木市三田町1-1-22
					947-513-5100

夜間照明制御盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

有限会社 松田電気工

晴れ

代表取締役


点検場所 管理棟2F更衣室 L-2電灯分電盤

現場代理人

管理棟2F放送室 夜間照明制御盤

点検場所	外観点検	絶縁測定・電圧測定・動作確認					
		ブレーカー名称	絶縁値(MΩ)	判定	電圧値(V)	判定	漏電遮断器動作確認
管理棟2F更衣室 L-2電灯分電盤	△	照明点灯盤制御電源 NFB2P20A	50	○	202	○	-
管理棟2F放送室	外観点検	名称	各照明点灯動作確認(残地動作確認含む)				
夜間照明点灯盤	△	照明点灯盤	○				
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。 ・絶縁・電圧 安全な範囲なので、特に問題はありません。 ・動作確認 その他のスイッチ(残置動作含む)特に問題ありません。 						

判定 ○良 △普通 ×不良

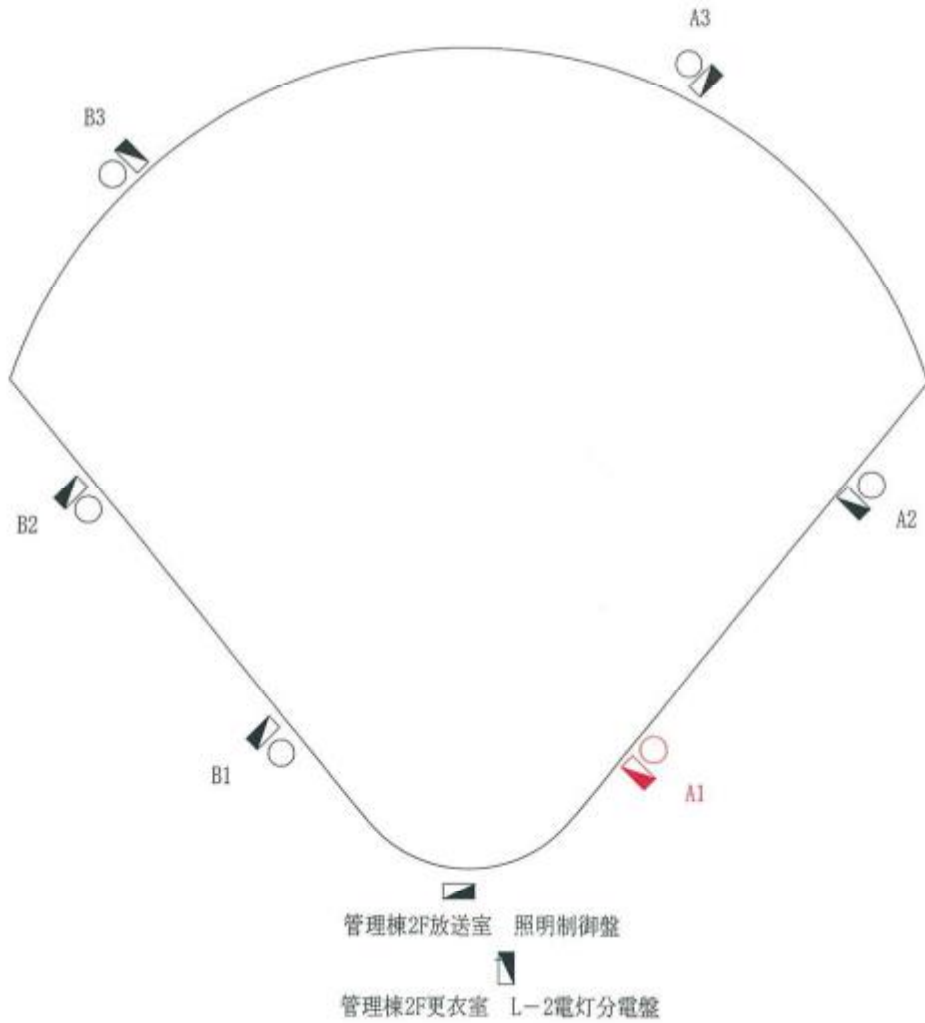

A1夜間照明柱位置図

1	2	3	4	5	6	照明	
7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24		
						25	殺虫灯

機器構成 (既存)

灯具 メーカー・品番・製造日分らず 24台

ランプ メーカー・品番・製造日分らず
メタルハライドランプ 1500W 24個

安定器 メーカー・品番・製造日分らず 200V 24台

塔内灯26~30

塔内非常電源専用盤

塔内照明分電盤

殺虫灯 ナショナル YJF22473 200V 2灯用 1台

塔内灯 ナショナル HW725T-R48 100V 1灯用 5台

A1夜間照明柱配置図

工事名称	令和6年度東京都立玉川野球場及び市立小学校体育館照明施設改修工事(夜間照明)	作成年月日	令和6年11月13日	図面番号	7
図面名称	夜間照明配置図 (A1夜間照明柱)	作成会社	株式会社 松田電気工事	発注者	株式会社 三田啓三
		図面作成者	松田 啓三	発注者	三田 啓三
		図面承認者	松田 啓三	発注者	三田 啓三
		図面承認者	松田 啓三	発注者	三田 啓三

A1夜間照明分電盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日
晴れ

請負人 有限会社 松田電

代表取締役

点検場所 A1塔内照明分電盤・非常電源盤

現場代理人

点検場所	外観点検	入力電圧測定(V)				回路絶縁抵抗測定(MΩ)			漏電遮断器 動作確認
		RS	ST	RT	判定	ブレーカ名	測定値	判定	
グラウンド	△	200	200	200	○	主幹 NFB3P150A	50	○	-
A1塔内照明分電盤	△	200	200	200	○	①1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	②1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	③2/3点灯照明 NFB3P20A	50	○	-
	△	200	200	200	○	④2/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑤全点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑥残置灯 NFB3P20A	19	△	-
	△	-	200	-	○	⑦殺虫灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑧変圧器一次 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑨終了予告灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑩塔内灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑪操作電源 NFB2P20A	50	○	-
グラウンド	△	0	-	-	○	①非常電源 NFB2P20A	50	○	-
A1塔内非常電源盤									
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。 ・外観 盤の外観・ボルト等、特に腐食等はありません。 ・電圧・絶縁 安全範囲なので、特に問題はありません。 ・動作確認 ブレーカー等、正常に使用できます。 								

判定 ○良 △普通 ×不良

A1夜間照明灯 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電

晴れ

代表取締役

点検場所 A1夜間照明灯


現場代理人

No.1

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド A1夜間照明灯	1	△	△	△	1	△	1	△	△
	2	△	△	△	2	△	2	△	△
	3	△	△	△	3	△	3	△	△
	4	△	△	×不点	4	△	4	△	△
	5	△	△	×不点	5	△	5	△	△
	6	△	△	△	6	△	6	△	△
	7	△	△	△	7	△	7	△	△
	8	△	△	×不点	8	△	8	△	△
	9	△	△	×不点	9	△	9	△	△
	10	△	△	×不点	10	△	10	△	△
	11	△	△	△	11	△	11	△	△
	12	△	△	×不点	12	△	12	△	△
	13	△	△	△	13	△	13	△	△
	14	△	△	△	14	△	14	△	△
	15	△	△	△	15	△	15	△	△
	16	△	△	△	16	△	16	△	△
	17	△	△	△	17	△	17	△	△
	18	△	△	△	18	△	18	△	△
	19	△	△	×不点	19	△	19	△	△


点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド A1夜間照明灯	20	△	△	×不点	20	△	20	△	△
	21	△	△	×不点	21	△	21	△	△
	22	△	△	×不点	22	△	22	△	△
	23	△	△	×不点	23	△	23	△	△
	24	△	△	×不点	24	△	24	△	△
殺虫器	25	△	△	×2本不点	25	-	25	△	-
塔内灯	26	△	△	△	26	-	26	△	-
	27	△	△	△	27	-	27	△	-
	28	△	△	△	28	-	28	△	-
	29	△	△	△	29	-	29	△	-
	30	△	△	△	30	-	30	△	-
各機器 配線等 異常箇所報告	<p>・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。</p> <p>・投光器 外観・構造・点灯には、特に問題はありません。</p> <p>・安定器 経年劣化で点灯したり消灯したりする所もあり。不点は、ランプ不良か安定器不良。</p> <p>・各機器固定ボルト 多少の腐食等は見られますが特に問題ありません。</p> <p>・ケーブル・ケーブル接続箇所 特に問題ありません。</p> <p>※共通事項 パテ脱落 配線支持バンド劣化。</p>								

判定 ○良 △普通 ×不良

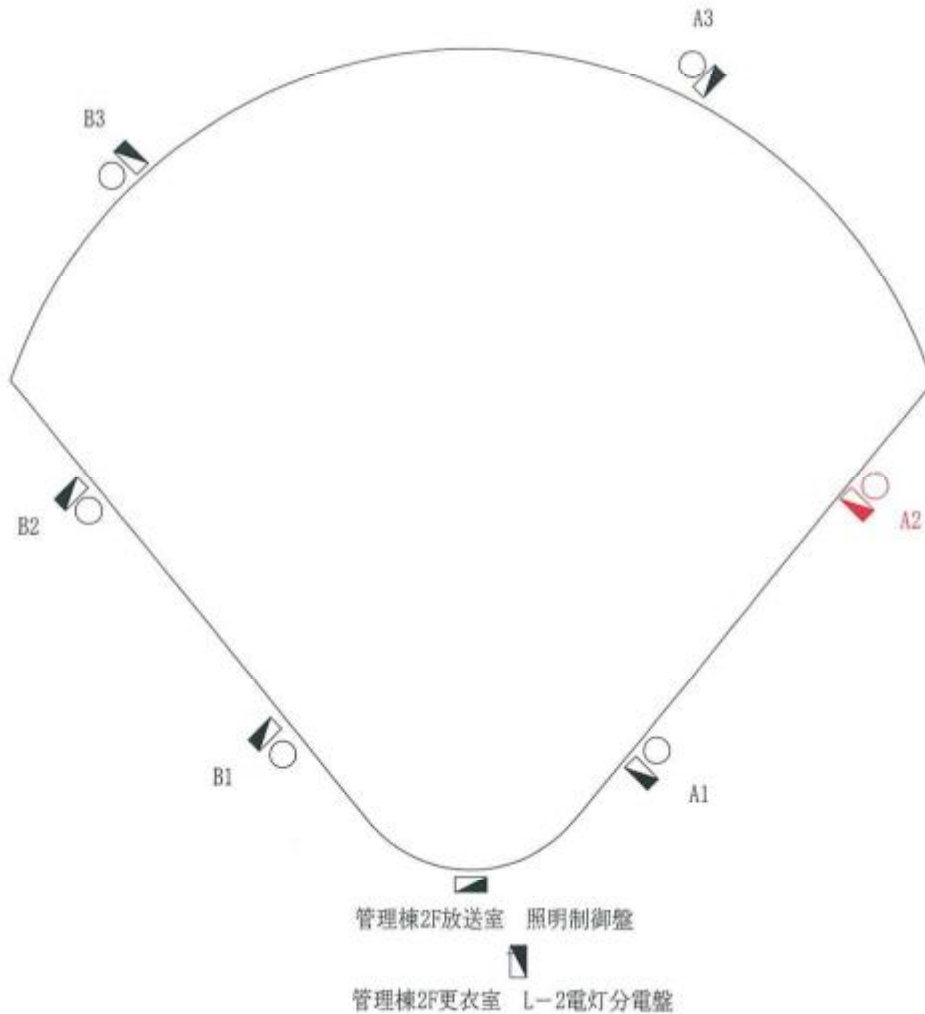

A2夜間照明柱位置図

1	2	3	4	5	6	照明
7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	

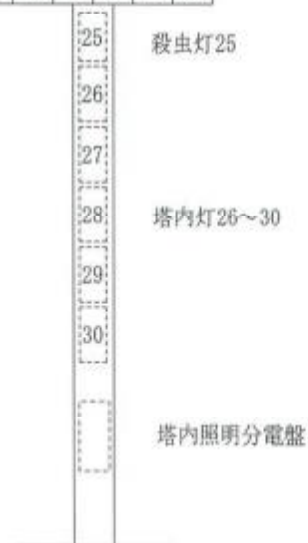

機器構成 (既存)

- 灯具 メーカー・品番・製造日分らず 24台
- ランプ メーカー・品番・製造日分らず
メタルハライドランプ 1500W 24個
- 安定器 メーカー・品番・製造日分らず 200V 24台
- 殺虫灯 ナショナル YJF22473 200V 2灯用 1台
- 塔内照明分電盤 塔内灯 ナショナル HW725T-R48 100V 1灯用 5台

A2夜間照明柱配置図

工事名称	令和5年度厚木市立玉川野球場及び市内小学校表部照明施設改修工事(体育施設)	作成年月日	令和5年 8.7.3.抄	図面番号	3
担当者	照明設備課 成瀬昭博(主任 玉川野球場)	作成者	照明設備課 成瀬昭博	縮尺	1/100
備考		依頼会社	有限会社 山田電気工事	図面内容	00P-2024-0100
			神奈川県厚木市三浦町1-1-22		

A2夜間照明分電盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電

晴れ

代表取締役

点検場所 A2塔内照明分電盤

現場代理人

点検場所	外観点検	入力電圧測定(V)				回路絶縁抵抗測定(MΩ)			漏電遮断器 動作確認
		RS	ST	RT	判定	ブレーカ名	測定値	判定	
グラウンド	△	200	200	200	○	主幹 NFB3P150A	50	○	-
A2塔内照明分電盤	△	200	200	200	○	①1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	②1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	③2/3点灯照明 NFB3P20A	50	○	-
	△	200	200	200	○	④2/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑤全点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑥残置灯 NFB3P20A	50	○	-
	△	-	200	-	○	⑦殺虫灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	200	-	-	○	⑧変圧器一次 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑨塔内灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑩操作電源 NFB2P20A	50	○	-
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているため交換時期になります。 ・外観 盤の外観・ボルト等、特に腐食等はありません。 ・電圧・絶縁 安全範囲なので、特に問題はありません。 ・動作確認 ブレーカー等、正常に使用できます。 								

判定 ○良 △普通 ×不良

A2夜間照明灯 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電

晴れ

代表取締役

点検場所 A2夜間照明灯


現場代理人

No.1

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド A2夜間照明灯	1	△	△	×不点	1	△	1	△	△
	2	△	△	△	2	△	2	△	△
	3	△	△	△	3	△	3	△	△
	4	△	△	×不点	4	△	4	△	△
	5	△	△	△	5	△	5	△	△
	6	△	△	×不点	6	△	6	△	△
	7	△	△	△	7	△	7	△	△
	8	△	△	△	8	△	8	△	△
	9	△	△	△	9	△	9	△	△
	10	△	△	△	10	△	10	△	△
	11	△	△	×不点	11	△	11	△	△
	12	△	△	×不点	12	△	12	△	△
	13	△	△	△	13	△	13	△	△
	14	△	△	△	14	△	14	△	△
	15	△	△	×不点	15	△	15	△	△
	16	△	△	×不点	16	△	16	△	△
	17	△	△	△	17	△	17	△	△
	18	△	△	△	18	△	18	△	△
	19	△	△	△	19	△	19	△	△


点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド A2夜間照明灯	20	△	△	△	20	△	20	△	△
	21	△	△	△	21	△	21	△	△
	22	△	△	△	22	△	22	△	△
	23	△	△	△	23	△	23	△	△
	24	△	△	×不点	24	△	24	△	△
殺虫器	25	△	△	×2本不点	25	-	25	△	-
塔内灯	26	△	△	△	26	-	26	△	-
	27	△	△	△	27	-	27	△	-
	28	△	△	△	28	-	28	△	-
	29	△	△	△	29	-	29	△	-
	30	△	△	△	30	-	30	△	-
各機器 配線等 異常箇所報告	<p>・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。</p> <p>・投光器 外観・構造・点灯には、特に問題はありません。</p> <p>・安定器 経年劣化で点灯したり消灯したりする所もあり。不点は、ランプ不良か安定器不良。</p> <p>・各機器固定ボルト 多少の腐食等は見られますが特に問題ありません。</p> <p>・ケーブル・ケーブル接続箇所 特に問題ありません。</p> <p>※共通事項 パテ脱落 配線支持バンド劣化。</p>								

判定 ○良 △普通 ×不良

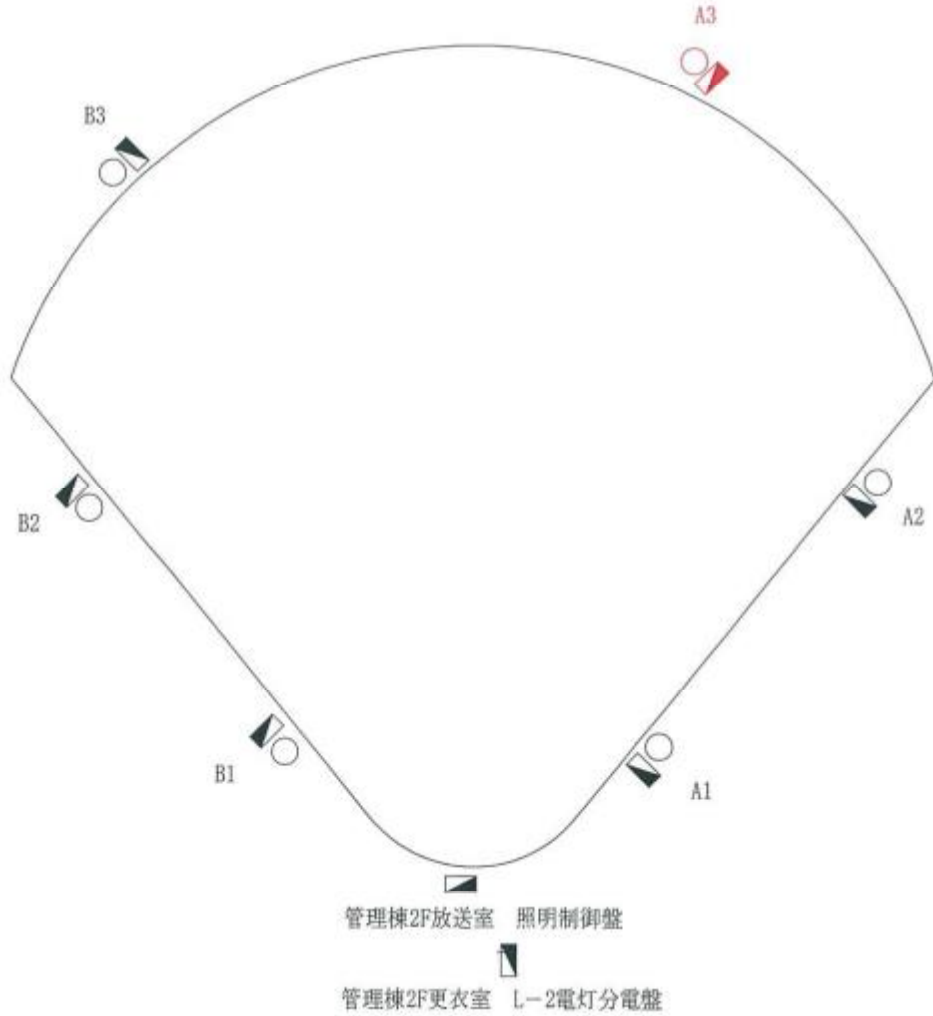

A3夜間照明柱位置図

1	2	3	4	5	6	照明
7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	

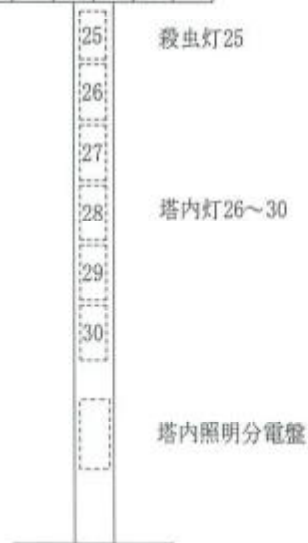

機器構成 (既存)

灯具 メーカー・品番・製造日分らず 24台

ランプ メーカー・品番・製造日分らず
メタルハライドランプ 1500W 24個

安定器 メーカー・品番・製造日分らず 200V 24台

殺虫灯 ナショナル YJF22473 200V 2灯用 1台

塔内灯 ナショナル HW725T-R48 100V 1灯用 5台

A3夜間照明柱配置図

工事名称 令和6年度厚木市立玉川野球場及び部分小学校体育館照明施設改修工事
 図面名称 夜間照明配置図 A3夜間照明柱 (玉川野球場)
 作成者 有馬 隆夫
 校舎外年月 令和6年 11月 13日
 図面番号 01F-310-0100

A3夜間照明分電盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日
 晴れ

請負人 有限会社 松田

代表取締役

点検場所 A3塔内照明分電盤

現場代理人

点検場所	外観点検	入力電圧測定(V)				回路絶縁抵抗測定(MΩ)			漏電遮断器 動作確認
		RS	ST	RT	判定	ブレーカ名	測定値	判定	
グラウンド	△	200	200	200	○	主幹 NFB3P150A	50	○	-
A3塔内照明分電盤	△	200	200	200	○	①1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	②1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	③2/3点灯照明 NFB3P20A	50	○	-
	△	200	200	200	○	④2/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑤全点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑥残置灯 NFB3P20A	50	○	-
	△	-	200	-	○	⑦殺虫灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	200	-	-	○	⑧変圧器一次 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑨塔内灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑩操作電源 NFB2P20A	50	○	-
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。 ・外観 盤の外観・ボルト等、特に腐食等はありません。 ・電圧・絶縁 安全範囲なので、特に問題はありません。 ・動作確認 ブレーカー等、正常に使用できます。 								

判定 ○良 △普通 ×不良

A3夜間照明灯 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電

晴れ

代表取締役

点検場所 A3夜間照明灯


現場代理人

No.1

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド A3夜間照明灯	1	△	△	△	1	△	1	△	△
	2	△	△	×不点	2	△	2	△	△
	3	△	△	△	3	△	3	△	△
	4	△	△	△	4	△	4	△	△
	5	△	△	△	5	△	5	△	△
	6	△	△	△	6	△	6	△	△
	7	△	△	△	7	△	7	△	△
	8	△	△	△	8	△	8	△	△
	9	△	△	△	9	△	9	△	△
	10	△	△	△	10	△	10	△	△
	11	△	△	△	11	△	11	△	△
	12	△	△	×不点	12	△	12	△	△
	13	△	△	△	13	△	13	△	△
	14	△	△	×不点	14	△	14	△	△
	15	△	△	△	15	△	15	△	△
	16	△	△	△	16	△	16	△	△
	17	△	△	△	17	△	17	△	△
	18	△	△	△	18	△	18	△	△
	19	△	△	×不点	19	△	19	△	△


点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド A3夜間照明灯	20	△	△	×不点	20	△	20	△	△
	21	△	△	×不点	21	△	21	△	△
	22	△	△	×不点	22	△	22	△	△
	23	△	△	×不点	23	△	23	△	△
	24	△	△	×不点	24	△	24	△	△
殺虫器	25	△	△	×2本不点	25	-	25	△	-
塔内灯	26	△	△	△	26	-	26	△	-
	27	△	△	△	27	-	27	△	-
	28	△ × カバー破損	△	△	28	-	28	△	-
	29	△	△	△	29	-	29	△	-
	30	△	△	△	30	-	30	△	-
各機器 配線等 異常箇所報告	<p>・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。</p> <p>・投光器 外観・構造・点灯には、特に問題はありません。</p> <p>・安定器 経年劣化で点灯したり消灯したりする所もあり。不点は、ランプ不良か安定器不良。</p> <p>・各機器固定ボルト 多少の腐食等は見られますが特に問題ありません。</p> <p>・ケーブル・ケーブル接続箇所 特に問題ありません。</p> <p>※共通事項 パテ脱落 配線支持バンド劣化。</p>								

判定 ○良 △普通 ×不良

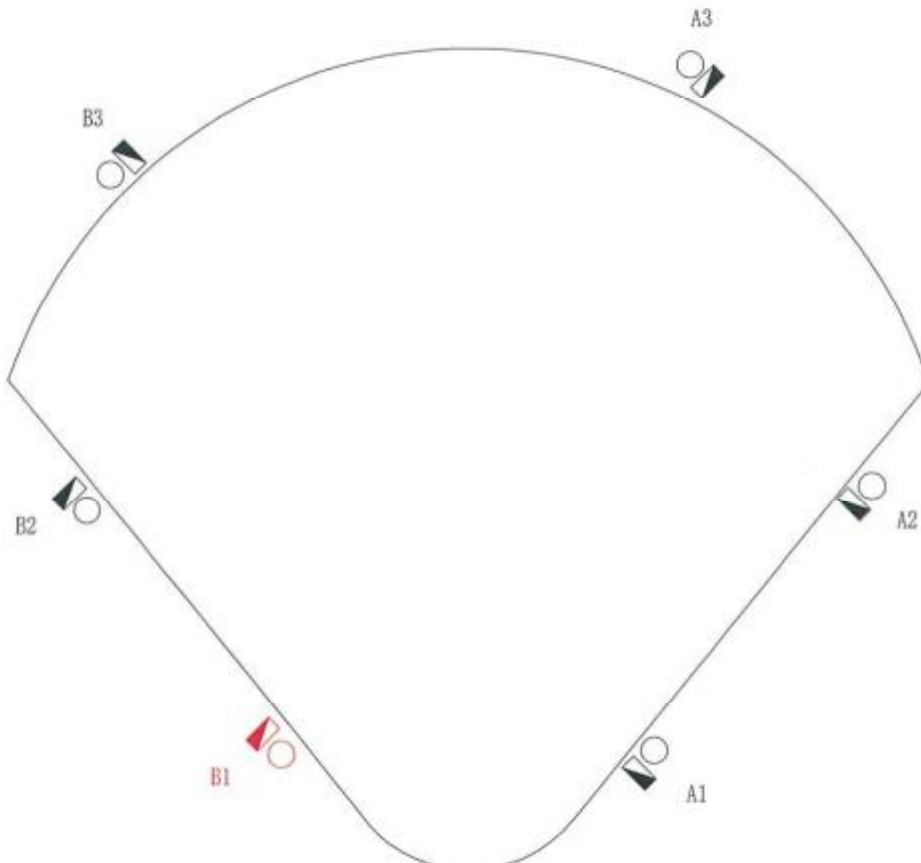

管理棟2F放送室 照明制御盤
 管理棟2F更衣室 L-2電灯分電盤

B1夜間照明柱位置図

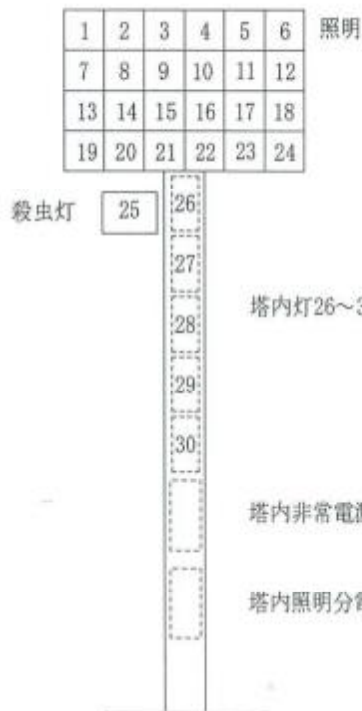

機器構成 (既存)

灯具 メーカー・品番・製造日分らず 24台

ランプ メーカー・品番・製造日分らず
 メタルハライドランプ 1500W 24個

安定器 メーカー・品番・製造日分らず 200V 24台

殺虫灯 ナショナル YJF22473 200V 2灯用 1台

塔内灯 ナショナル HW725T-R48 100V 1灯用 5台

B1夜間照明柱配置図

作業名称 令和6年度厚木市常玉川野球場及び市内小学校改修工事施設整備事業
 実施年度 令和7年度
 実施月 7月
 実施日 7月31日
 作成者 株式会社 設計電気工事 株式会社 設計電気工事 株式会社 設計電気工事
 承認者 株式会社 設計電気工事 株式会社 設計電気工事 株式会社 設計電気工事
 図面名称 B1夜間照明柱位置図
 図面番号 04F-248-100

B1夜間照明分電盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田

晴れ

代表取締役

点検場所 B1塔内照明分電盤・非常電源盤

現場代理人

点検場所	外観点検	入力電圧測定(V)				回路絶縁抵抗測定(MΩ)			漏電遮断器 動作確認
		RS	ST	RT	判定	ブレーカ名	測定値	判定	
グラウンド	△	200	200	200	○	主幹 NFB3P150A	50	○	-
B1塔内照明分電盤	△	200	200	200	○	①1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	②1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	③2/3点灯照明 NFB3P20A	50	○	-
	△	200	200	200	○	④2/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑤全点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑥残置灯 NFB3P20A	50	○	-
	△	-	200	-	○	⑦殺虫灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	200	-	-	○	⑧変圧器一次 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑨塔内灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑩操作電源 NFB2P20A	50	○	-
グラウンド	△	0	-	-	○	①非常電源 NFB2P20A	50	○	-
B1塔内非常電源盤									
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。 ・外観 盤の外観・ボルト等、特に腐食等はありません。 ・電圧・絶縁 安全範囲なので、特に問題はありません。 ・動作確認 ブレーカー等、正常に使用できます。 								

判定 ○良 △普通 ×不良

B1夜間照明灯 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電気

晴れ

代表取締役 鏡

点検場所 B1夜間照明灯


現場代理人 鏡

No.1


点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド B1夜間照明灯	1	△	△	△	1	△	1	△	△
	2	△	△	△	2	△	2	△	△
	3	△	△	△	3	△	3	△	△
	4	△	△	△	4	△	4	△	△
	5	△	△	△	5	△	5	△	△
	6	△	△	×不点	6	△	6	△	△
	7	△	△	△	7	△	7	△	△
	8	△	△	×不点	8	△	8	△	△
	9	△	△	△	9	△	9	△	△
	10	△	△	△	10	△	10	△	△
	11	△	△	△	11	△	11	△	△
	12	△	△	△	12	△	12	△	△
	13	△	△	△	13	△	13	△	△
	14	△	△	×不点	14	△	14	△	△
	15	△	△	△	15	△	15	△	△
	16	△	△	×不点	16	△	16	△	△
	17	△	△	△	17	△	17	△	△
	18	△	△	×不点	18	△	18	△	△
	19	△	△	×不点	19	△	19	△	△

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド B1夜間照明灯	20	△	△	×不点	20	△	20	△	△
	21	△	△	×不点	21	△	21	△	△
	22	△	△	×不点	22	△	22	△	△
	23	△	△	×不点	23	△	23	△	△
	24	△	△	×不点	24	△	24	△	△
殺虫器	25	△保護ガード 破損	△	×2本不点	25	-	25	△	-
塔内灯	26	△	△	△	26	-	26	△	-
	27	△	△	△	27	-	27	△	-
	28	△	△	△	28	-	28	△	-
	29	△	△	△	29	-	29	△	-
	30	△	△	△	30	-	30	△	-
各機器 配線等 異常箇所報告	<p>・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。</p> <p>・投光器 外観・構造・点灯には、特に問題はありません。</p> <p>・安定器 経年劣化で点灯したり消灯したりする所もあり。不点は、ランプ不良か安定器不良。</p> <p>・各機器固定ボルト 多少の腐食等は見られますが特に問題ありません。</p> <p>・ケーブル・ケーブル接続箇所 特に問題ありません。</p> <p>※共通事項 パテ脱落 配線支持バンド劣化。</p>								

判定 ○良 △普通 ×不良

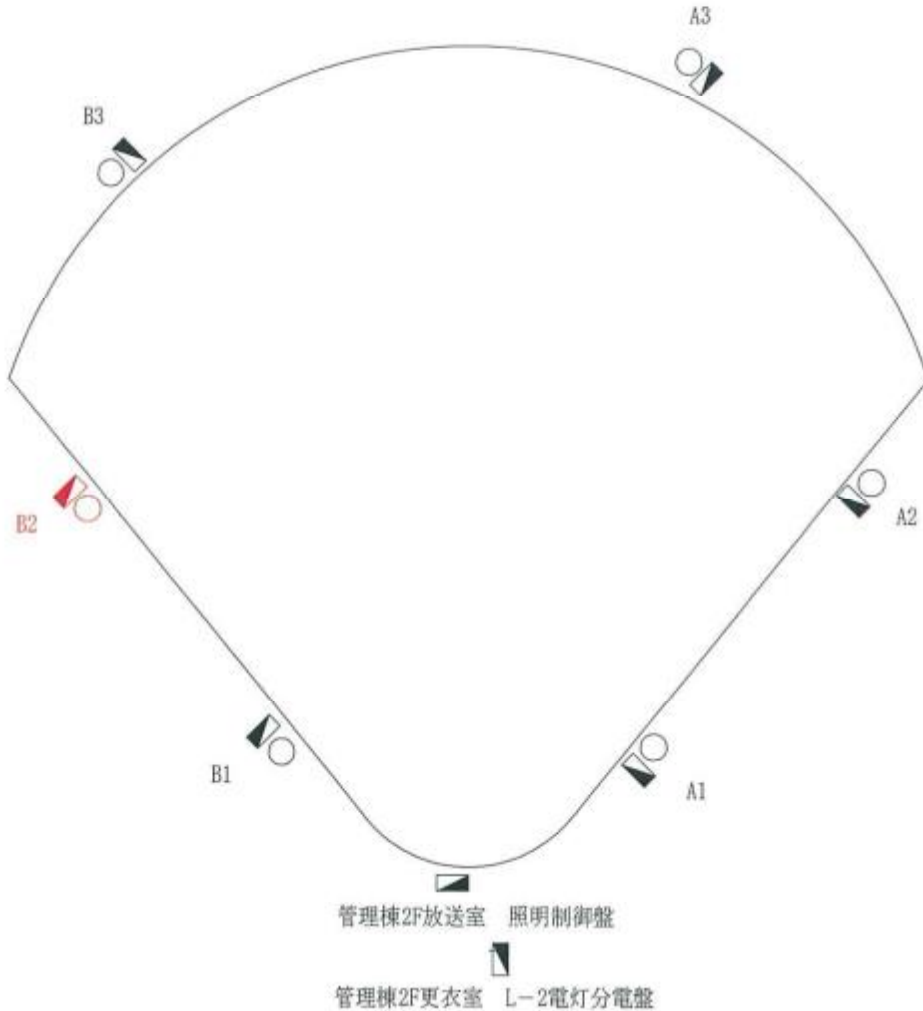

B2夜間照明柱位置図

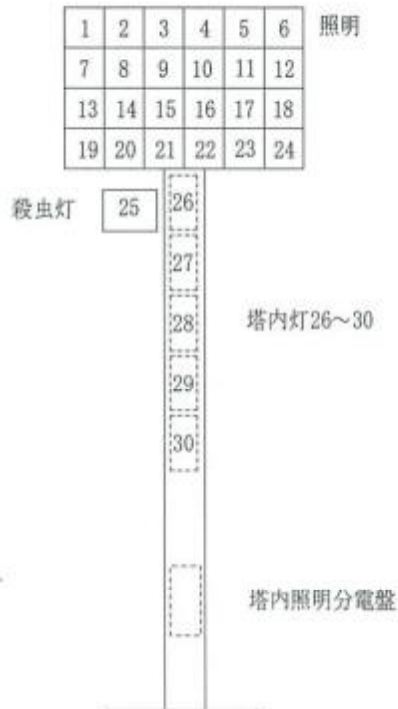

機器構成 (既存)

灯具 メーカー・品番・製造日分らず 24台

ランプ メーカー・品番・製造日分らず
メタルハライドランプ 1500W 24個

安定器 メーカー・品番・製造日分らず 200V 24台

殺虫灯 ナショナル YJF22473 200V 2灯用 1台

塔内灯 ナショナル HW725T-R48 100V 1灯用 5台

B2夜間照明柱配置図

工事名称	令和4年度那珂市営玉川野球場及び市内小学校体育館照明施設改修工事(夜間照明)	発注者	那珂市
図面名称	夜間照明配置図	作成者	佐藤 誠
発行年月日	令和4.10.10	図面番号	01
作成会社	佐藤誠設計事務所	図面枚数	1/1
制作場所	神奈川県那珂市三田町1-1-22	縮尺	1/100

B2夜間照明分電盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田

晴れ

代表取締役

点検場所 B2塔内照明分電盤

現場代理人

点検場所	外観点検	入力電圧測定(V)				回路絶縁抵抗測定(MΩ)			漏電遮断器 動作確認
		RS	ST	RT	判定	ブレーカ名	測定値	判定	
グラウンド	△	200	200	200	○	主幹 NFB3P150A	50	○	-
B2塔内照明分電盤	△	200	200	200	○	①1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	②1/3点灯照明 NFB3P40A	6	△	-
	△	200	200	200	○	③2/3点灯照明 NFB3P20A	50	○	-
	△	200	200	200	○	④2/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑤全点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑥残置灯 NFB3P20A	50	○	-
	△	-	200	-	○	⑦殺虫灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	200	-	-	○	⑧変圧器一次 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑨塔内灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑩操作電源 NFB2P20A	50	○	-
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。 ・外観 盤の外観・ボルト等、特に腐食等はありません。 ・電圧・絶縁 安全範囲なので、特に問題はありません。絶縁は0.1MΩ以上あれば、特に問題ありません。 ・動作確認 ブレーカー等、正常に使用できます。 								

判定 ○良 △普通 ×不良

B2夜間照明灯 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市宮玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電機

晴れ

代表取締役

点検場所 B2夜間照明灯


現場代理人

No.1

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド B2夜間照明灯	1	△	△	△	1	△	1	△	△
	2	△	△	△	2	△	2	△	△
	3	△	△	×不点	3	△	3	△	△
	4	△	△	△	4	△	4	△	△
	5	△	△	△	5	△	5	△	△
	6	△	△	△	6	△	6	△	△
	7	△	△	△	7	△	7	△	△
	8	△	△	△	8	△	8	△	△
	9	△	△	△	9	△	9	△	△
	10	△	△	△	10	△	10	△	△
	11	△	△	△	11	△	11	△	△
	12	△	△	△	12	△	12	△	△
	13	△	△	△	13	△	13	△	△
	14	△	△	△	14	△	14	△	△
	15	△	△	△	15	△	15	△	△
	16	△	△	△	16	△	16	△	△
	17	△	△	×不点	17	△	17	△	△
	18	△	△	△	18	△	18	△	△
	19	△	△	×不点	19	△	19	△	△

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド B2夜間照明灯	20	△	△	△	20	△	20	△	△
	21	△	△	△	21	△	21	△	△
	22	△	△	△	22	△	22	△	△
	23	△	△	△	23	△	23	△	△
	24	△	△	△	24	△	24	△	△
殺虫器	25	△	△	×2本の内 1本不点	25	-	25	△	-
塔内灯	26	△	△	△	26	-	26	△	-
	27	△	△	△	27	-	27	△	-
	28	△	△	△	28	-	28	△	-
	29	△	△	△	29	-	29	△	-
	30	△	△	△	30	-	30	△	-
各機器 配線等 異常箇所報告	<p>・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。</p> <p>・投光器 外観・構造・点灯には、特に問題はありません。</p> <p>・安定器 経年劣化で点灯したり消灯したりする所もあり。不点は、ランプ不良か安定器不良。</p> <p>・各機器固定ボルト 多少の腐食等は見られますが特に問題ありません。</p> <p>・ケーブル・ケーブル接続箇所 特に問題ありません。</p> <p>※共通事項 バテ脱落 配線支持バンド劣化。</p>								


判定 ○良 △普通 ×不良

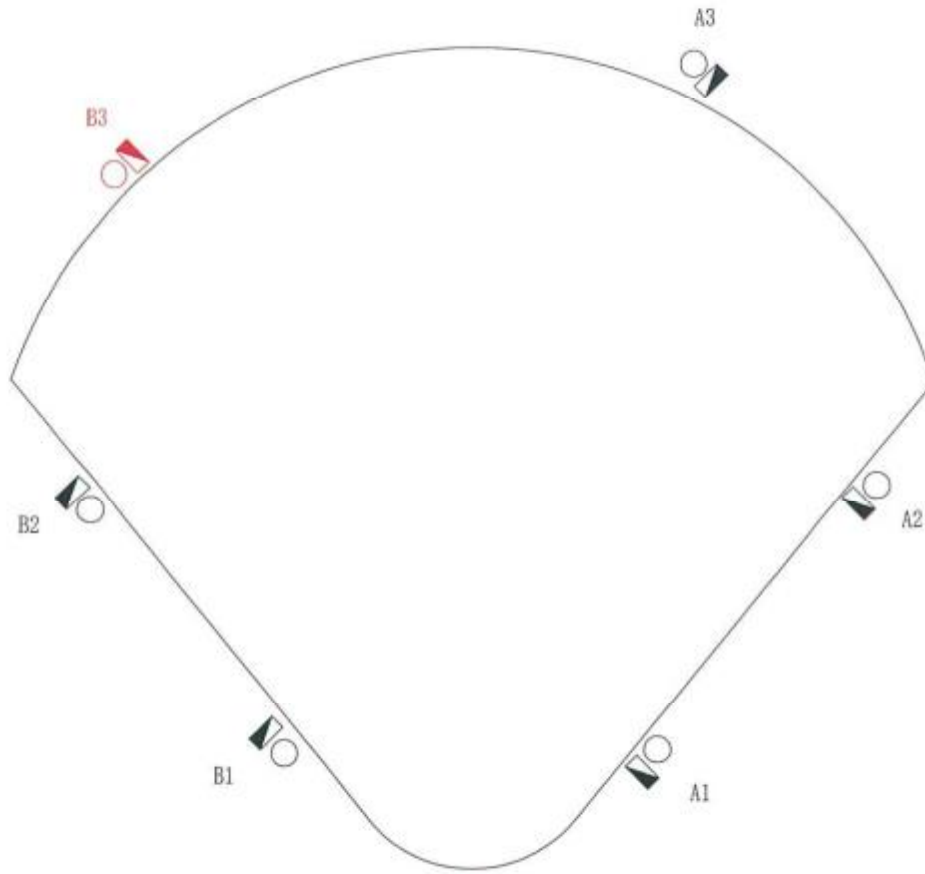

管理棟2F放送室 照明制御盤
 管理棟2F更衣室 L-2電灯分電盤

B3夜間照明柱位置図

1	2	3	4	5	6	照明
7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	

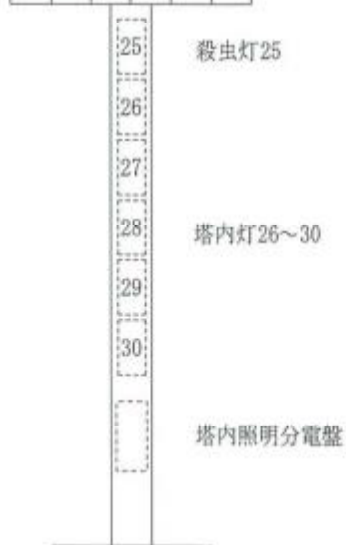

機器構成 (既存)

灯具 メーカー・品番・製造日分らず 24台

ランプ メーカー・品番・製造日分らず
 メタルハライドランプ 1500W 24個

安定器 メーカー・品番・製造日分らず 200V 24台

殺虫灯 ナショナル YJF22473 200V 2灯用 1台

塔内灯 ナショナル HW725T-R48 100V 1灯用 5台

B3夜間照明柱配置図

B3夜間照明分電盤 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田

晴れ

代表取締役

点検場所 B3塔内照明分電盤

現場代理人

点検場所	外観点検	入力電圧測定(V)				回路絶縁抵抗測定(MΩ)			漏電遮断器 動作確認
		RS	ST	RT	判定	ブレーカ名	測定値	判定	
グラウンド	△	200	200	200	○	主幹 NFB3P150A	50	○	-
B3塔内照明分電盤	△	200	200	200	○	①1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	②1/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	③2/3点灯照明 NFB3P20A	50	○	-
	△	200	200	200	○	④2/3点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑤全点灯照明 NFB3P40A	50	○	-
	△	200	200	200	○	⑥残置灯 NFB3P20A	50	○	-
	△	-	200	-	○	⑦殺虫灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	200	-	-	○	⑧変圧器一次 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑨塔内灯 NFB2P20A	50	○	-
	△	99	-	-	○	⑩操作電源 NFB2P20A	50	○	-
各機器・配線等 異常箇所報告	<ul style="list-style-type: none"> ・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているため交換時期になります。 ・外観 盤の外観・ボルト等、特に腐食等はありません。 ・電圧・絶縁 安全範囲なので、特に問題はありません。 ・動作確認 ブレーカー等、正常に使用できます。 								

判定 ○良 △普通 ×不良

B3夜間照明灯 点検報告書

令和7年3月8日

工事名称 令和6年度厚木市営玉川野球場及び市内小学校夜間照明施設保守点検業務委託

工事場所 玉川野球場(厚木市小野286-6)

点検日 令和7年2月26日

請負人 有限会社 松田電機

晴れ

代表取締役

点検場所 B3夜間照明灯

現場代理人

No.1

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド B3夜間照明灯	1	△	△	○	1	△	1	△	△
	2	△	△	×不点	2	△	2	△	△
	3	△	△	○	3	△	3	△	△
	4	△	△	×不点	4	△	4	△	△
	5	△	△	×不点	5	△	5	△	△
	6	△	△	×不点	6	△	6	△	△
	7	△	△	○	7	△	7	△	△
	8	△	△	○	8	△	8	△	△
	9	△	△	×不点	9	△	9	△	△
	10	△	△	○	10	△	10	△	△
	11	△	△	×不点	11	△	11	△	△
	12	△	△	×不点	12	△	12	△	△
	13	△	△	×不点	13	△	13	△	△
	14	△	△	○	14	△	14	△	△
	15	△	△	○	15	△	15	△	△
	16	△	△	×不点	16	△	16	△	△
	17	△	△	○	17	△	17	△	△
	18	△	△	○	18	△	18	△	△
	19	△	△	×不点	19	△	19	△	△

点検場所	投光器本体		ランプ		安定器		各投光器・安定器		
	番号	外観点検	外観点検	点灯確認	番号	外観点検	番号	器具・安定器固定ボルトの点検	ケーブル接続部点検
グラウンド B3夜間照明灯	20	△	△	×不点	20	△	20	△	△
	21	△	△	×不点	21	△	21	△	△
	22	△	△	×不点	22	△	22	△	△
	23	△	△	×不点	23	△	23	△	△
	24	△	△	×不点	24	△	24	△	△
殺虫器	25	△	△	×2本不点	25	-	25	△	-
塔内灯	26	△	△	×不点	26	-	26	△	-
	27	△	△	×不点	27	-	27	△	-
	28	△	△	×不点	28	-	28	△	-
	29	△	△	×不点	29	-	29	△	-
	30	△	△	×不点	30	-	30	△	-
各機器 配線等 異常箇所報告	<p>・全体 特に問題はありません。1998年製 27年経過しているので交換時期になります。</p> <p>・投光器 外観・構造・点灯には、特に問題はありません。</p> <p>・安定器 経年劣化で点灯したり消灯したりする所もあり。不点は、ランプ不良か安定器不良。</p> <p>・各機器固定ボルト 多少の腐食等は見られますが特に問題ありません。</p> <p>・ケーブル・ケーブル接続箇所 特に問題ありません。</p> <p>・カラスの巣除去</p> <p>※共通事項 バテ脱落 配線支持バンド劣化。</p>								

判定 ○良 △普通 ×不良



工事

玉川野球場

夜間照明制御盤

管理棟2F更衣室

L-2電灯分電盤

外観



工事

玉川野球場

夜間照明制御盤

管理棟2F更衣室

L-2電灯分電盤

外観



工事


玉川野球場

夜間照明制御盤

管理棟2F放送室

照明制御盤

外観

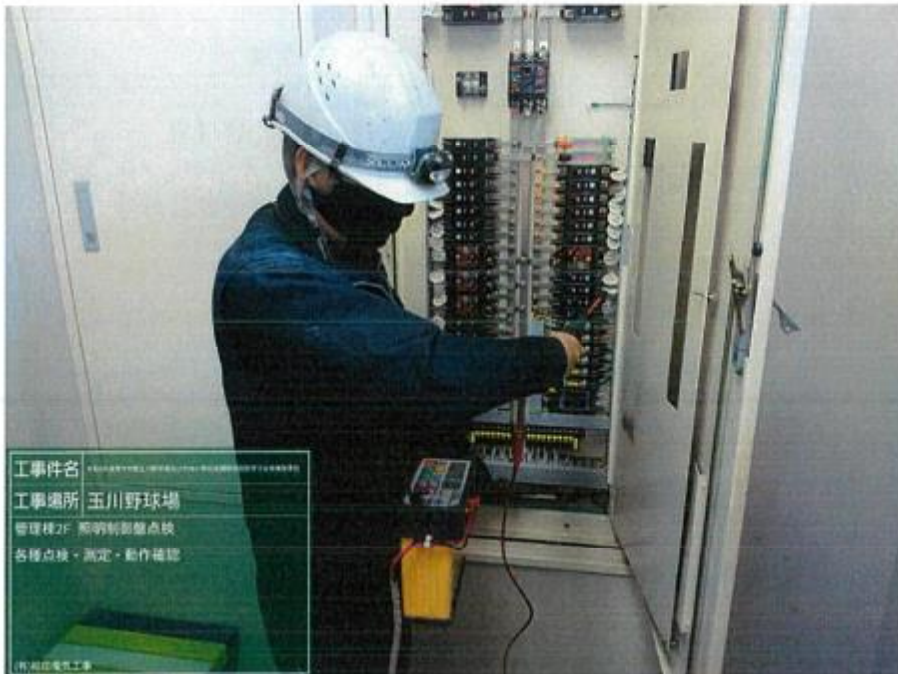

工事件名
 工事場所 玉川野球場
 管理棟2F 照明制御盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

夜間照明制御盤

管理棟2F更衣室

L-2電灯分電盤

各種点検・動作確認



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 管理棟2F 照明制御盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事


玉川野球場

夜間照明制御盤

管理棟2F放送室

照明制御盤

各種点検・動作確認

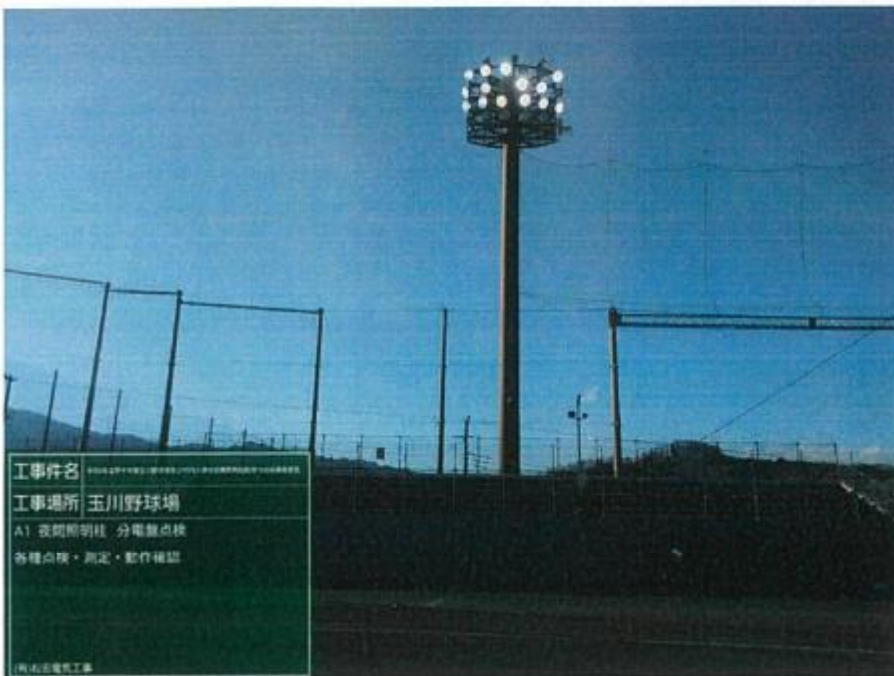

工事件名 玉川野球場 夜間照明柱 分電盤点検
工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
株式会社電気工事


工事

玉川野球場

A-1夜間照明

投光器

全景・点灯確認

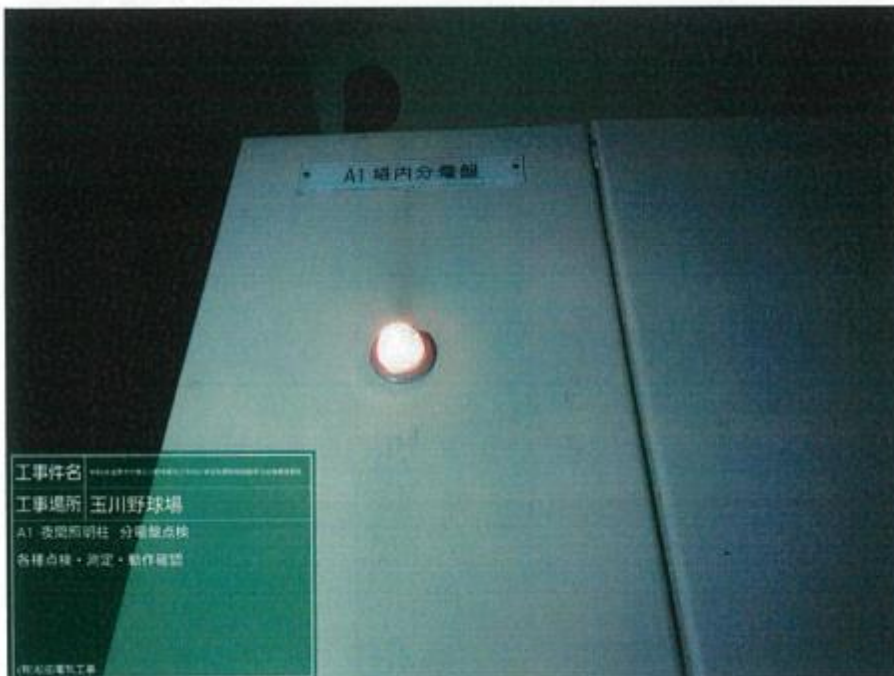

工事件名 玉川野球場 夜間照明柱 分電盤点検
工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1塔内分電盤

外観



工事件名 玉川野球場 夜間照明柱 分電盤点検
工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1非常電源専用盤

外觀



工事件名 夜間照明柱・分電盤点検
 工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱・分電盤点検
 非常電源盤
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1非常電源専用盤

盤内部



工事件名 夜間照明柱・分電盤点検
 工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

A-1塔内分電盤

各種点検・動作確認



工事件名 夜間照明柱・分電盤点検
 工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

投光器

外観



工事

玉川野球場

A-1夜間照明

投光器

外観



工事

玉川野球場

A-1夜間照明

安定器

外観



工事

玉川野球場

A-1夜間照明

安定器

外観



工事件名 夜間照明の点検・調整・動作確認
 工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

安定器

外観



工事件名 夜間照明の点検・調整・動作確認
 工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-1夜間照明

殺虫器

外観



工事件名 夜間照明の点検・調整・動作確認
 工事場所 玉川野球場
 A1 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

A-1夜間照明

殺虫器

品番 ナショナル YJP22473

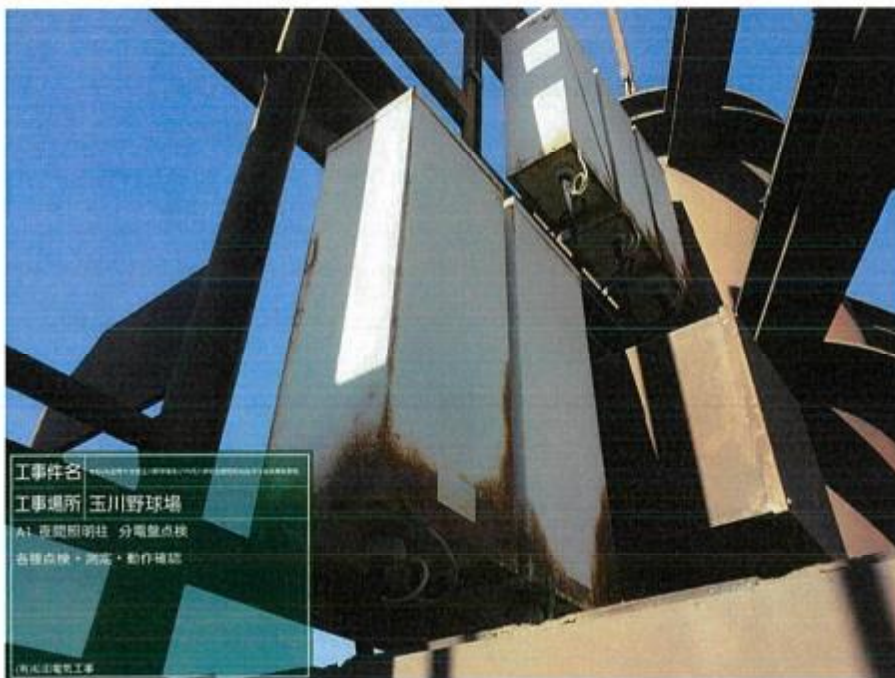


工事

玉川野球場

A-1夜間照明

安定器

各所安定器の腐食

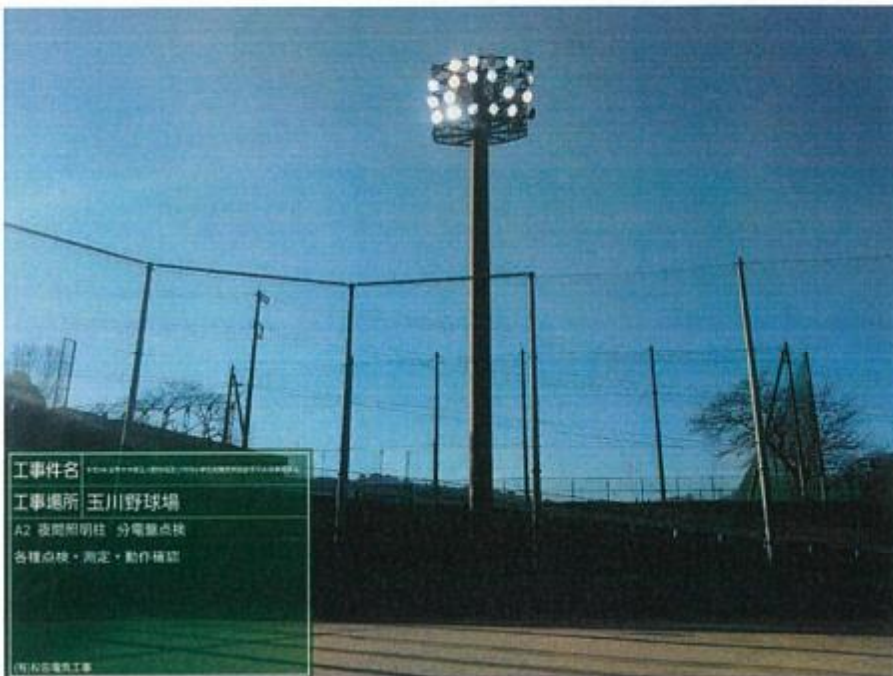

工事件名
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

投光器

全景・点灯確認



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

A-2塔内分電盤

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

A-2塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-2夜間照明

A-2塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-2夜間照明

A-2塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-2夜間照明

A-2塔内分電盤

盤内部



工事件名 夜間照明柱 分電盤点検
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)松田電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

A-2塔内分電盤

各種点検・動作確認



工事件名 夜間照明柱 分電盤点検
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)松田電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

投光器

外観



工事件名 夜間照明柱 分電盤点検
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)松田電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

投光器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

安定器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

安定器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

殺虫器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-2夜間照明

殺虫器

品番 ナショナル YJP22473



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

A-2夜間照明

安定器

各所安定器の腐食

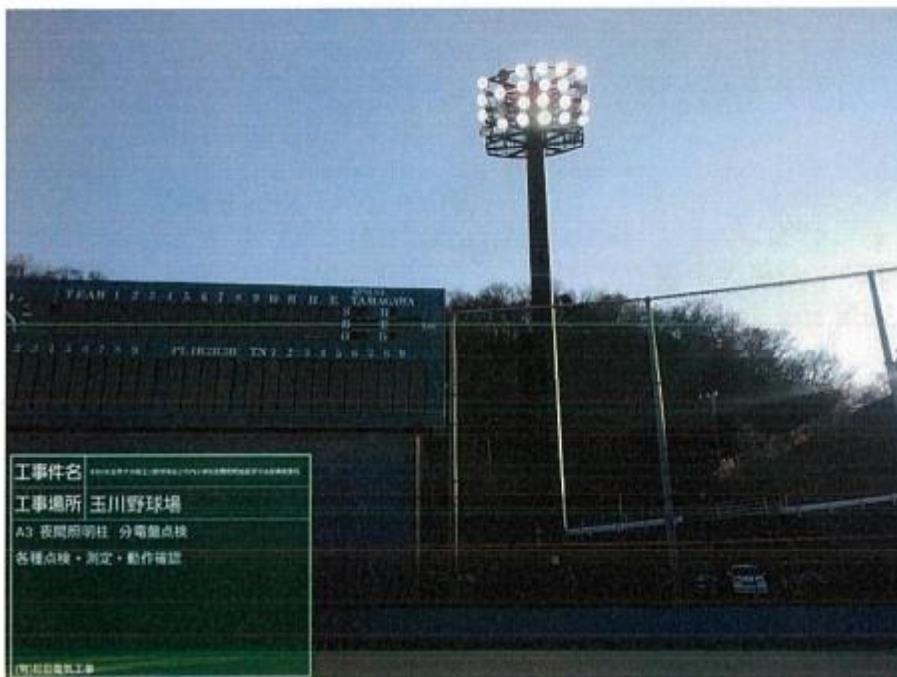

工事件名
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

投光器

全景・点灯確認



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

A-3塔内分電盤

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

A-3塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

A-3夜間照明

A-3塔内分電盤

盤内部




工事

玉川野球場

A-3夜間照明

A-3塔内分電盤

盤内部

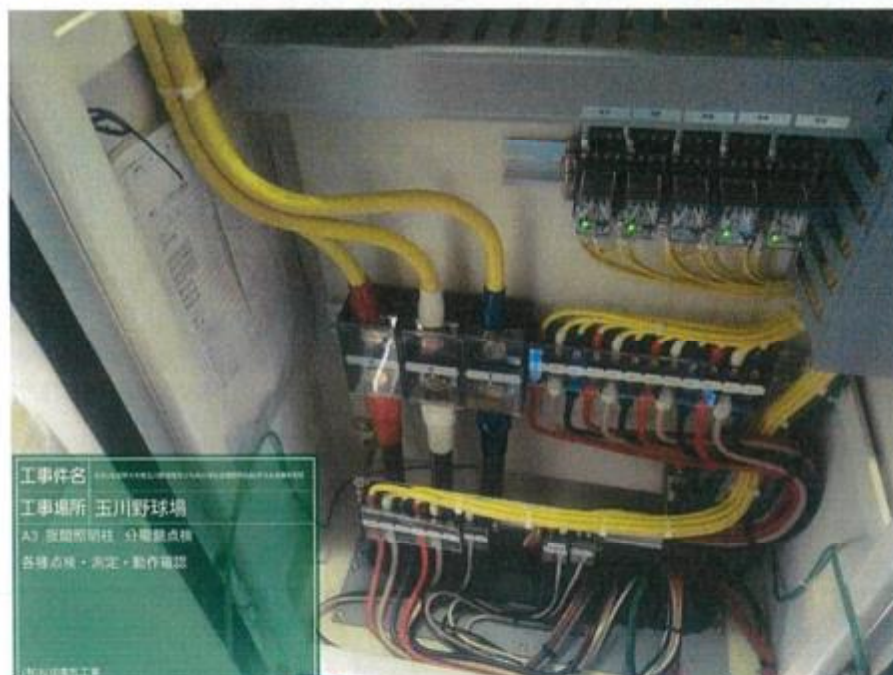

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

A-3塔内分電盤

盤内部



工事件名 玉川野球場 夜間照明
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)和信電気工事

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

A-3塔内分電盤

外観



工事件名 玉川野球場 夜間照明
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)和信電気工事


工事

玉川野球場

A-3夜間照明

投光器

外観

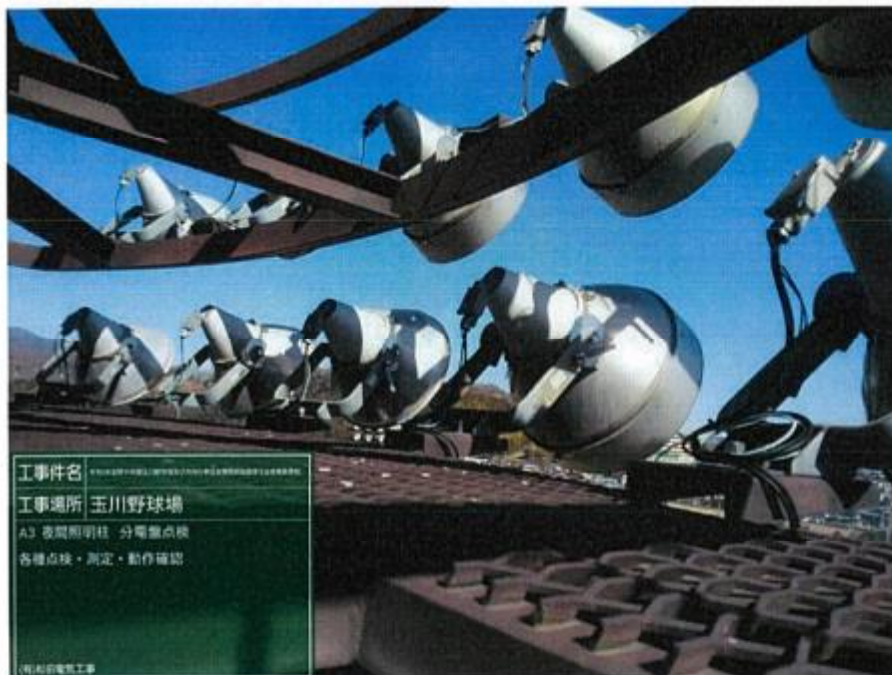

工事件名 玉川野球場 夜間照明
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)和信電気工事

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

投光器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

A-3夜間照明

安定器

全景・点灯確認

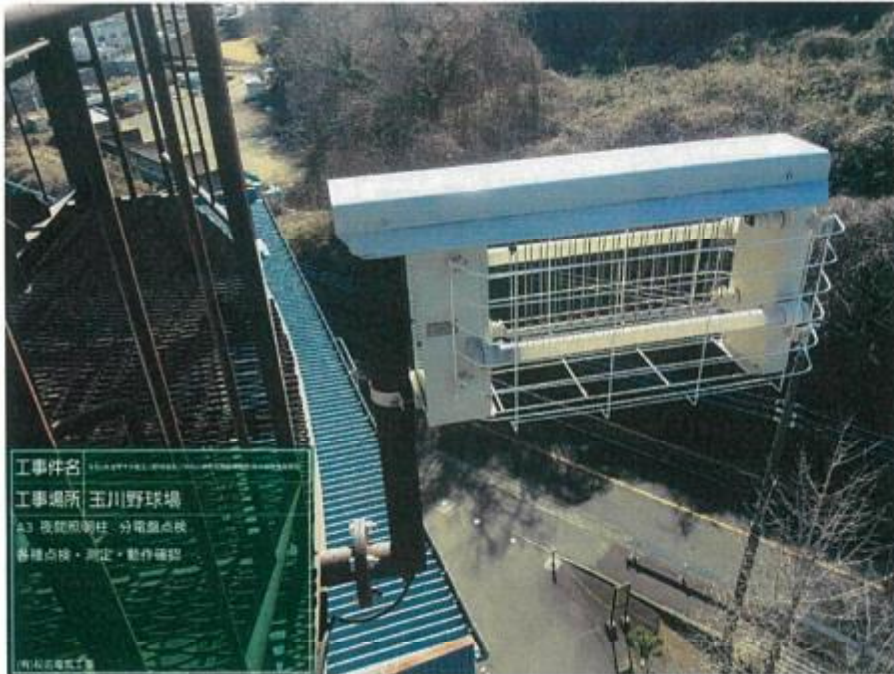

工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

A-3夜間照明

殺虫器

外観

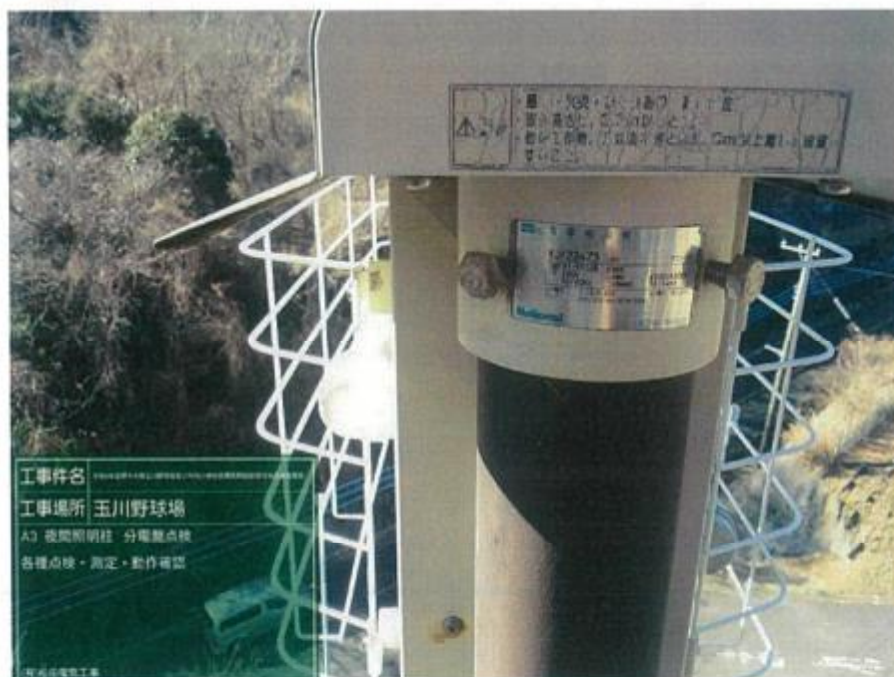

工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 A3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

A-3夜間照明

殺虫器

品番 ナショナル YJP22473




工事

玉川野球場

A-3夜間照明

塔内灯No. 28

カバー破損

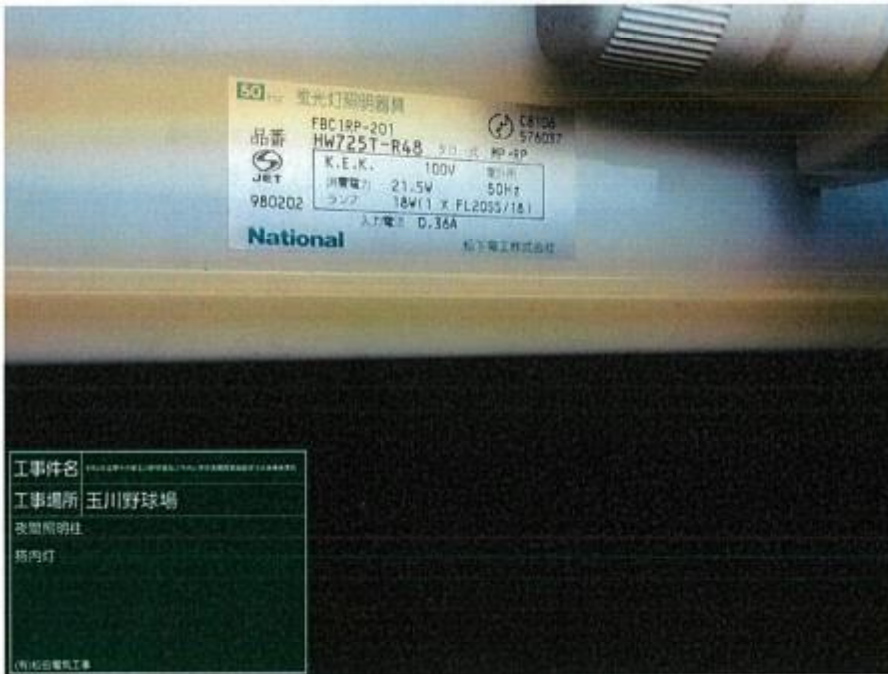


工事

玉川野球場

A-3夜間照明

塔内灯

品番 ナショナル HW725T-48

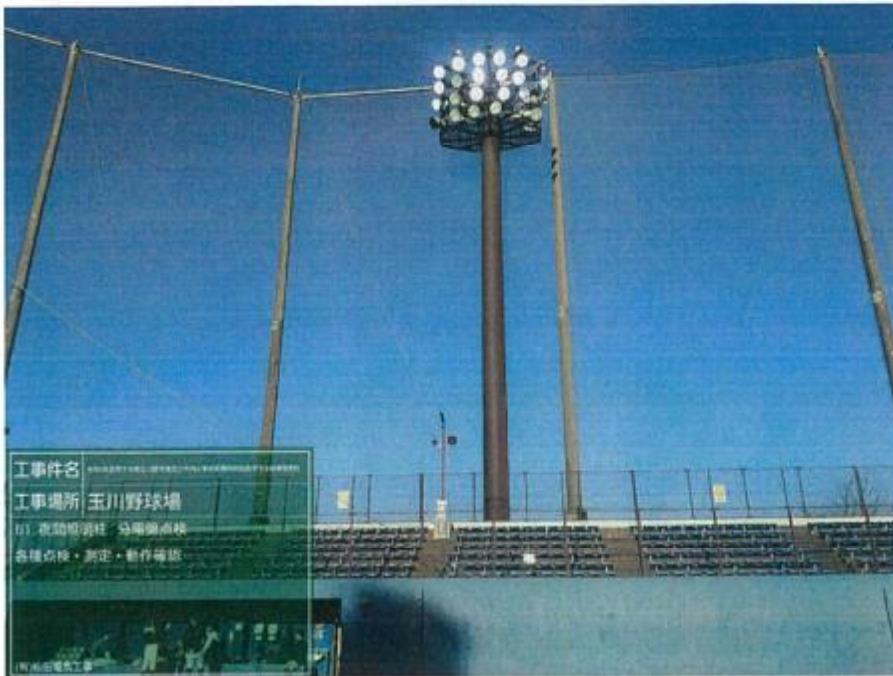

工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

投光器

全景・点灯確認



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1塔内分電盤

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1非常電源専用盤

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 非常電源盤
 各種点検・測定・動作確認
 (株)山電電気工事

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1非常電源専用盤

盤内部



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)山電電気工事

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

B-1塔内分電盤

各種点検・動作確認



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)山電電気工事


工事

玉川野球場

B-1夜間照明

投光器

外観

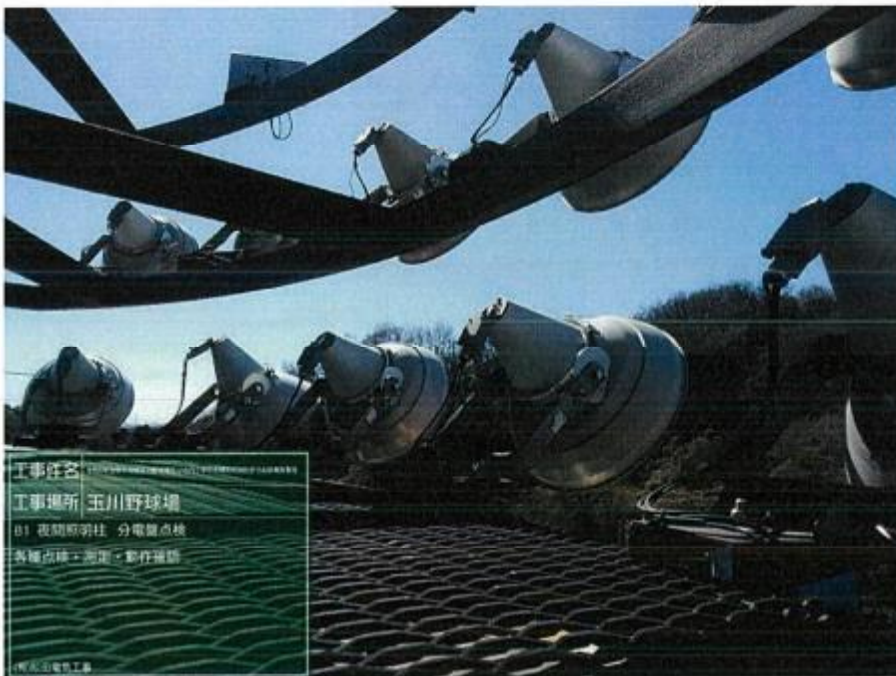

工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

B-1夜間照明

投光器

外観

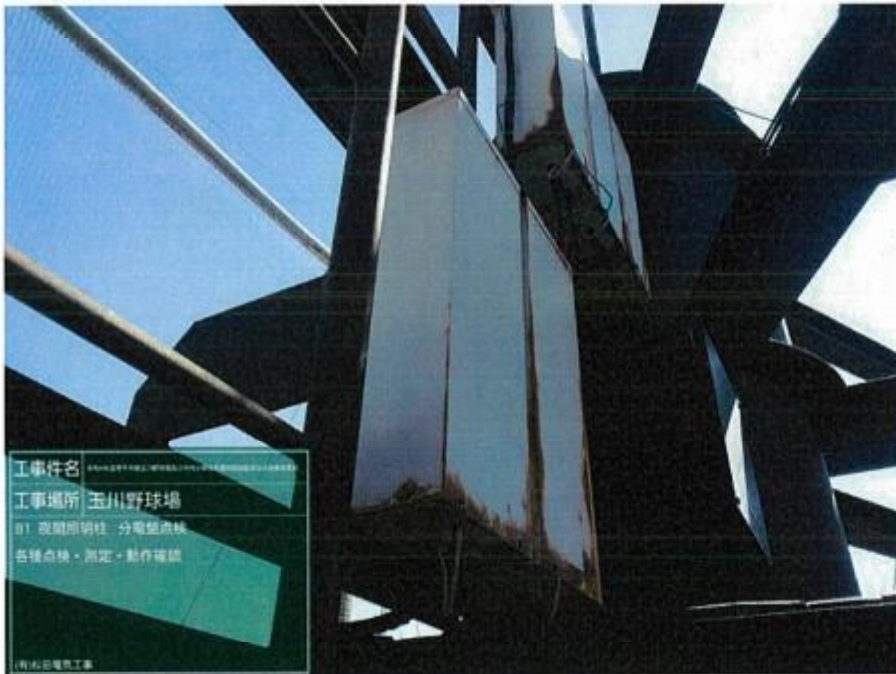

工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

安定器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

B-1夜間照明

安定器

外観

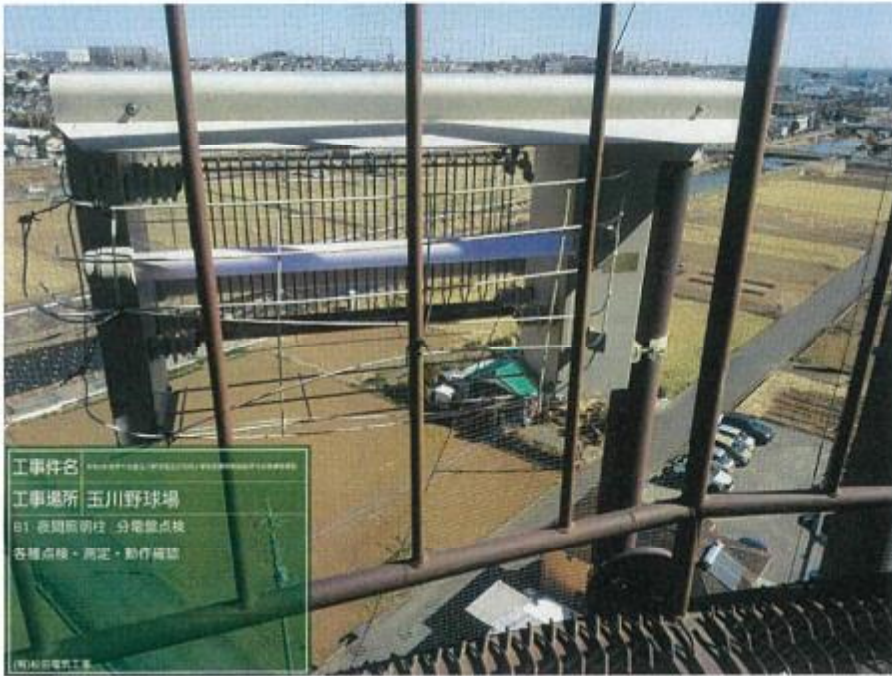

工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株) 田嶋電気工事

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

殺虫器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株) 田嶋電気工事

工事

玉川野球場

B-1夜間照明

殺虫器

品番 ナショナル YJP22473



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B1 夜間照明柱
 殺虫器ガード破損
 (株) 田嶋電気工事


工事

玉川野球場

B-1夜間照明

殺虫灯

保護ガード破損

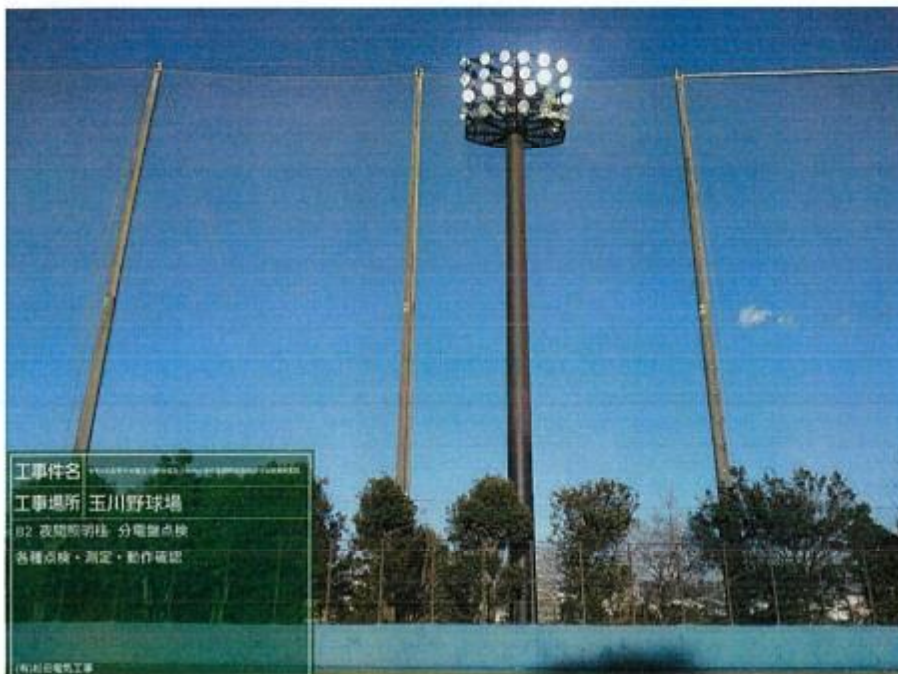

工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)利正電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

殺虫器

全景・点灯確認



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)利正電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

B-2塔内分電盤

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)利正電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

B-2塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-2夜間照明

B-2塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-2夜間照明

B-2塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-2夜間照明

B-2塔内分電盤



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)高圧電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

投光器

外観



工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)高圧電気工事


工事

玉川野球場

B-2夜間照明

投光器

外観

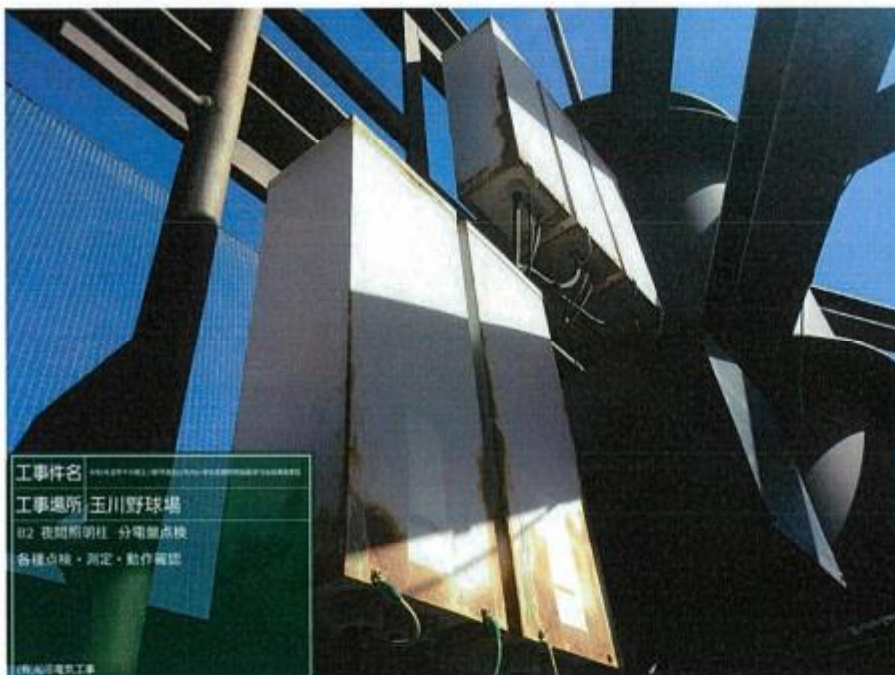

工事件名 玉川野球場
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (有)高圧電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

安定器

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

安定器

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事

工事

玉川野球場

B-2夜間照明

殺虫器

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B2 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 株式会社電気工事


工事

玉川野球場

B-2夜間照明

殺虫器

品番 ナショナル YJP22473

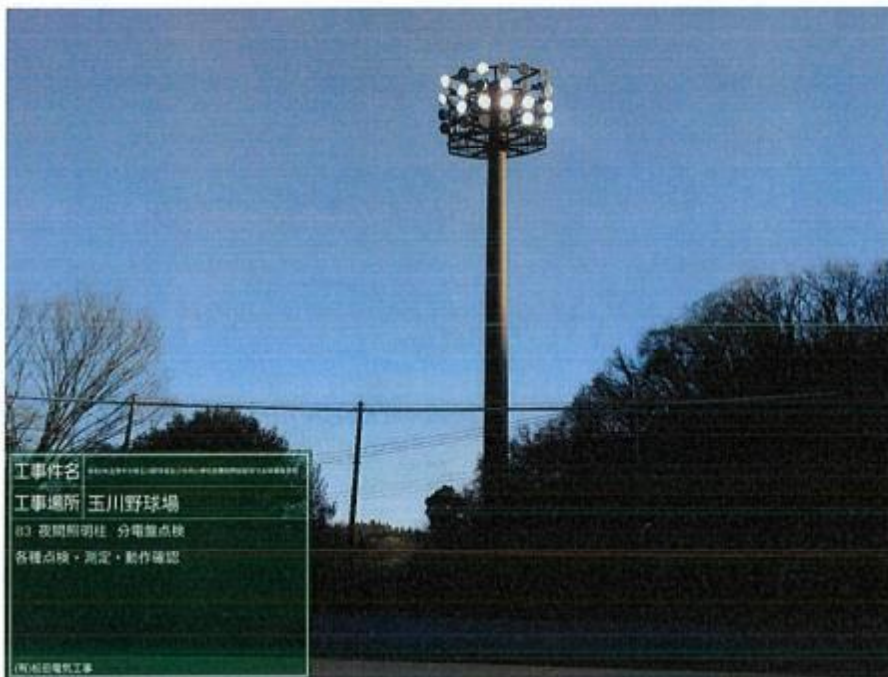

工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)日通電気工事

工事

玉川野球場

B-3夜間照明

投光器

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)日通電気工事

工事

玉川野球場

B-3夜間照明

B-3塔内分電盤

外観



工事件名
 工事場所 玉川野球場
 B3 夜間照明柱 分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
 (株)日通電気工事

工事

玉川野球場

B-3夜間照明

B-3塔内分電盤

盤内部



工事

玉川野球場

B-3夜間照明

B-3塔内分電盤

盤内部




工事

玉川野球場

B-3夜間照明

B-3塔内分電盤

盤内部

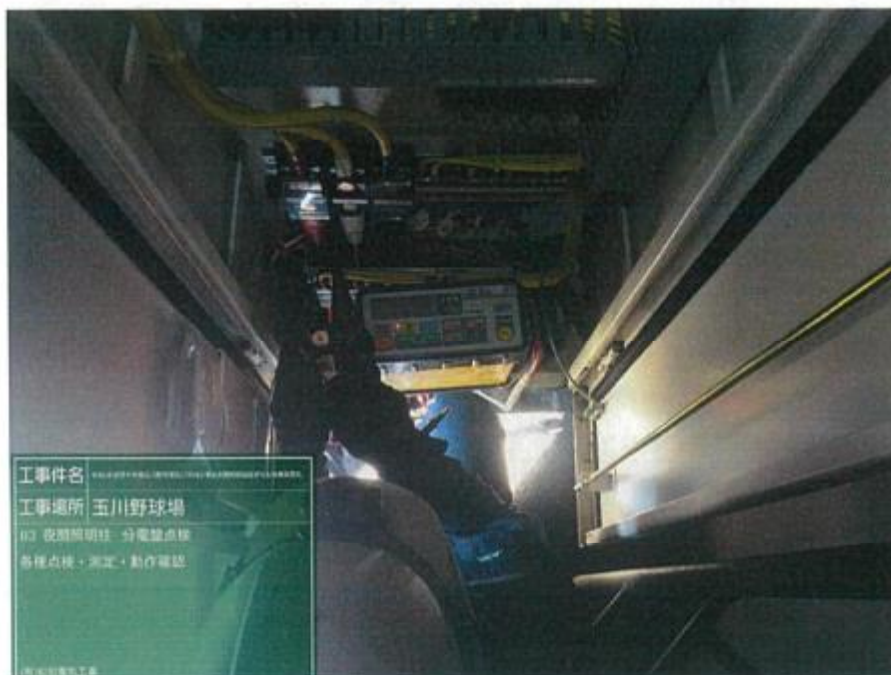

工事

玉川野球場

B-3夜間照明

B-3塔内分電盤

各種点検・動作確認



工事

玉川野球場

B-3夜間照明

殺虫器

外観




工事

玉川野球場

B-3夜間照明

安定器

外観

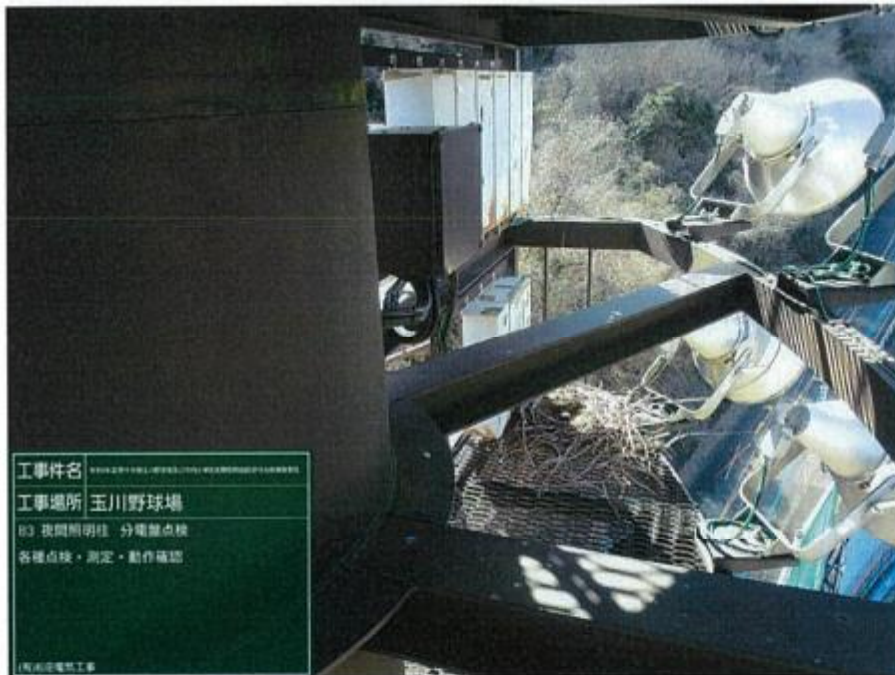


工事

玉川野球場

B-3夜間照明

安定器

外観

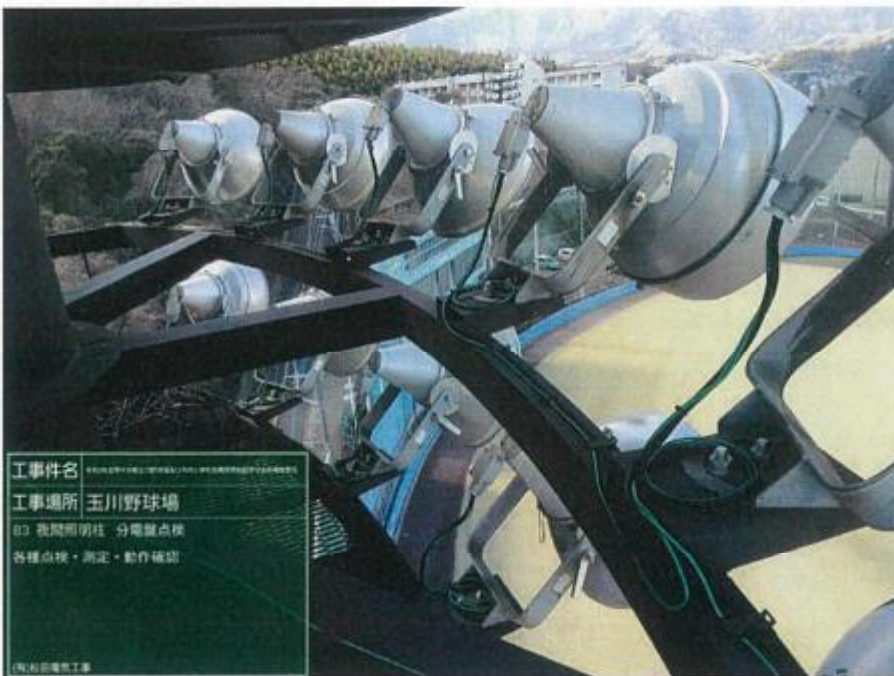

工事件名 玉川野球場の夜間照明設備の点検・保守
工事場所 玉川野球場
 B3 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
有限会社電気工事

工事

玉川野球場

B-3夜間照明

投光器

外観



工事件名 玉川野球場の夜間照明設備の点検・保守
工事場所 玉川野球場
 B3 夜間照明柱・分電盤点検
 各種点検・測定・動作確認
有限会社電気工事


工事

玉川野球場

B-3夜間照明

投光器

外観

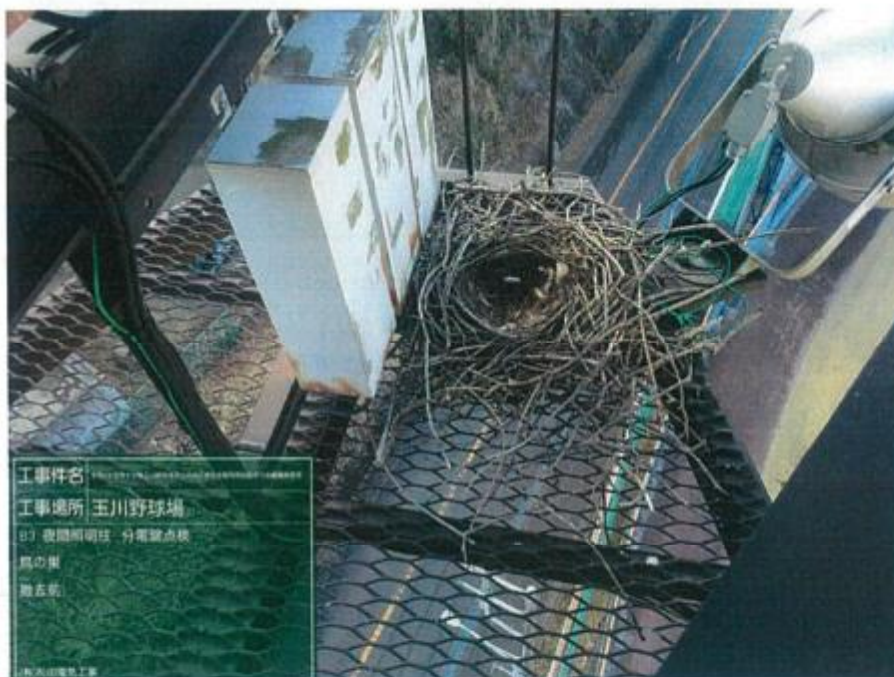

工事件名 玉川野球場の夜間照明設備の点検・保守
工事場所 玉川野球場
 B3 夜間照明柱・分電盤点検
 鳥の巣
 撤去前
有限会社電気工事


工事

玉川野球場

B-3夜間照明

カラスの巣除去

撤去前

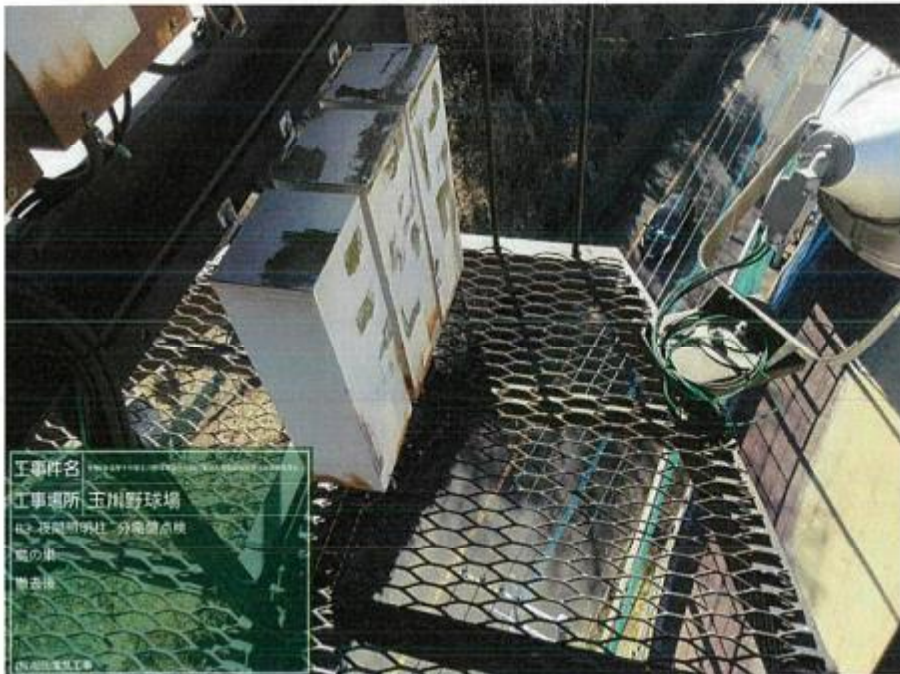

工事件名
工事場所 玉川野球場
施工 夜間照明 分電盤点検
施工 電気工事
株式会社
株式会社

工事

玉川野球場

B-3夜間照明

カラスの巣除去

撤去後
