北小学校施設建て替え整備に係る仮設校舎設置説明会

厚木市教育委員会学校施設課

日時：令和７年８月３０日（土）午後１時30分～

場所：北小学校　体育館

本日の内容

(1) 建て替え整備概要

(2) 仮設校舎設置概要

(1) 建て替え整備概要

建て替え対象施設の概要

建物名	建築年度	更新時期
南棟校舎	S41(1966)	R8(2026)
北棟校舎	S53(1978)	R40(2058)
西棟校舎	S49(1974)	R36(2054)

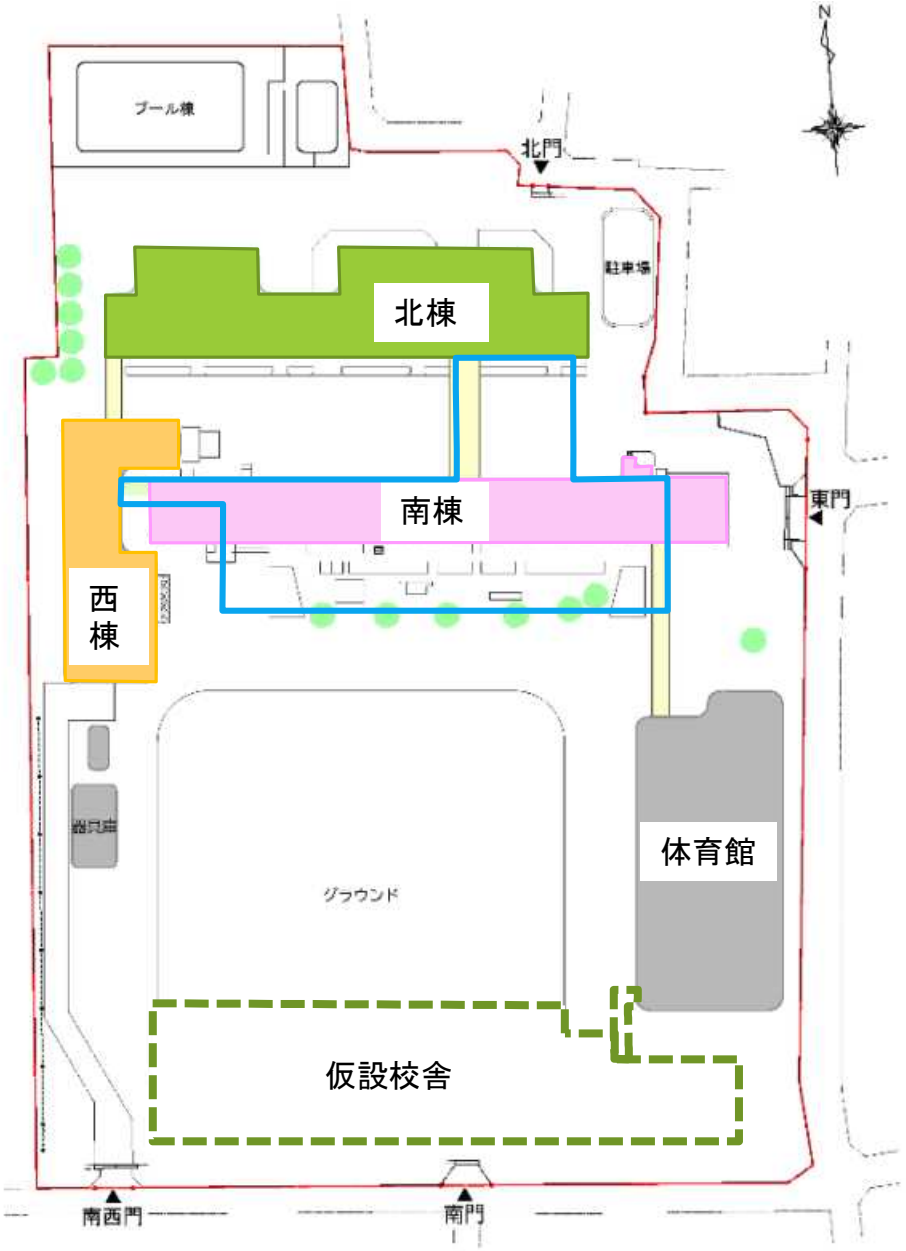

(1) 建て替え整備概要

事業スケジュール

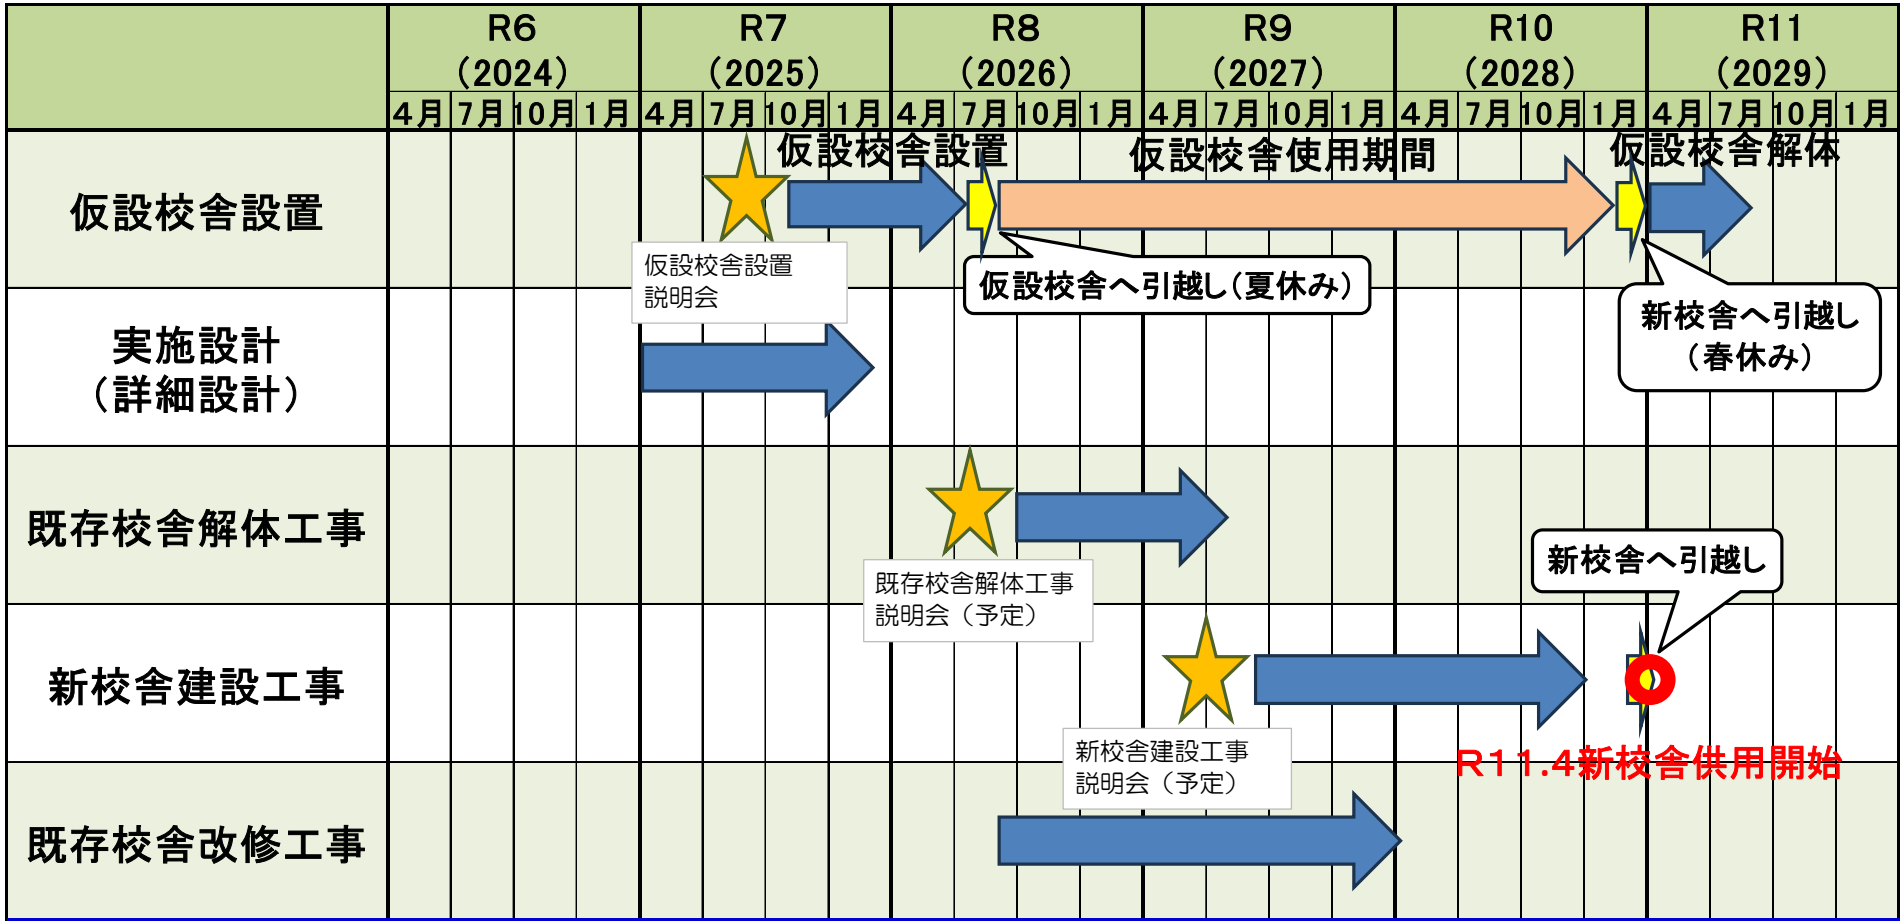

(1) 建て替え整備概要

工事ステップ図

今回説明範囲

①仮設校舎整備（令和7年10月～令和8年7月）

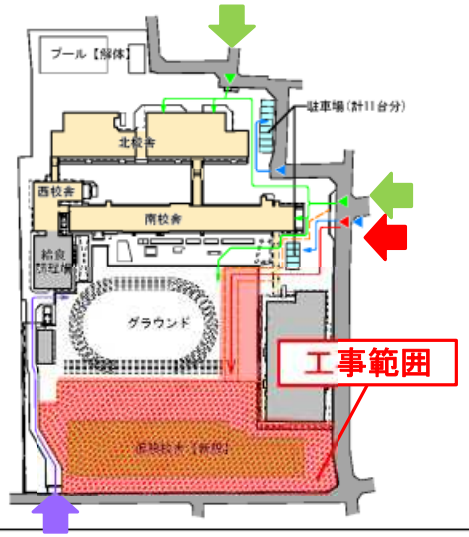

②南校舎 プール解体（令和8年10月～令和9年7月）
既存校舎改修（令和8年10月～令和10年3月）

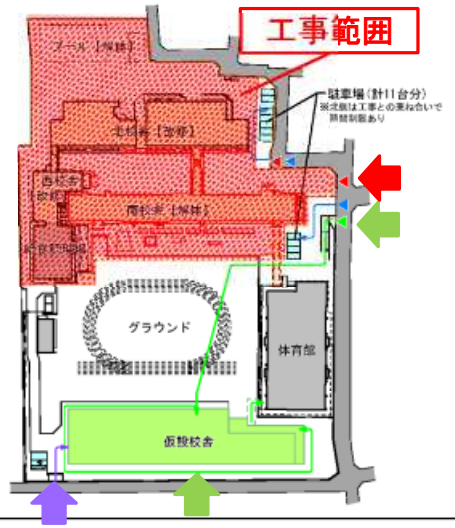

③新設校舎整備（令和9年9月～令和10年12月）
既存校舎改修（令和8年10月～令和10年3月）

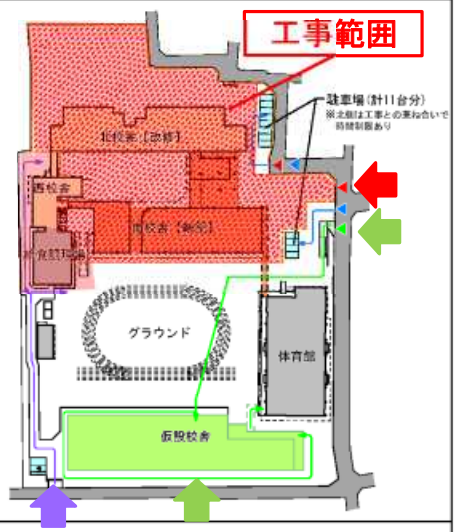

④仮設校舎解体（令和11年4月～令和11年8月）

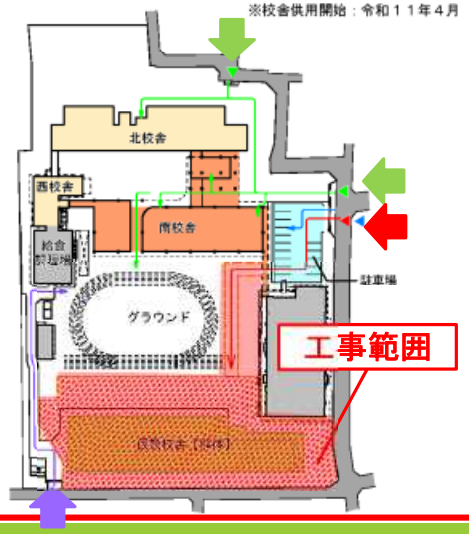

⑤工事完了（令和11年9月～）

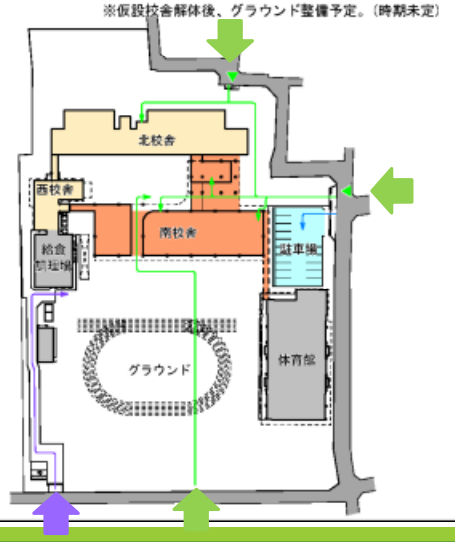

給食の提供

解体工事中のみ、南部学校給食センターで調理し、配送。

（令和８年９月から令和９年７月まで）

- 児童出入口
- 工事車両出入口
- 給食車両出入口

(2) 仮設校舎設置概要

北小学校仮設校舎賃貸借
概要説明

東海リース株式会社

(2) 仮設校舎設置概要

①計画概要

②工事概要

③仮設校舎配置図・平面図・立面図

④工事工程表

⑤工事期間中の近隣の方への配慮について

(2) 仮設校舎設置概要

計画概要

設置場所：神奈川県厚木市山際 658 番地
（厚木市立北小学校　校庭内）
工事期間：令和 7 年 10 月～令和 8 年 7 月予定
賃貸借期間：令和 8 年 7 月～令和 11 年 4 月予定
概　　要：敷地面積：18,758.68 ㎡
建築面積：1,804.82 ㎡
延床面積：5,021.85 ㎡
構　　造：鉄骨造
階　　数：3 階

(2) 仮設校舎設置概要

工事概要(工事車両進入出ルート)

・大型工事車両の進入は 9 時以降とし、青線のルートで出入りする。
・作業員工事車両は児童の登校時間を避け、8 時までに赤線のルートで入場する。
・車両の出入りの際、徐行を行う。

(2) 仮設校舎設置概要

工事概要
(仮設計画図)

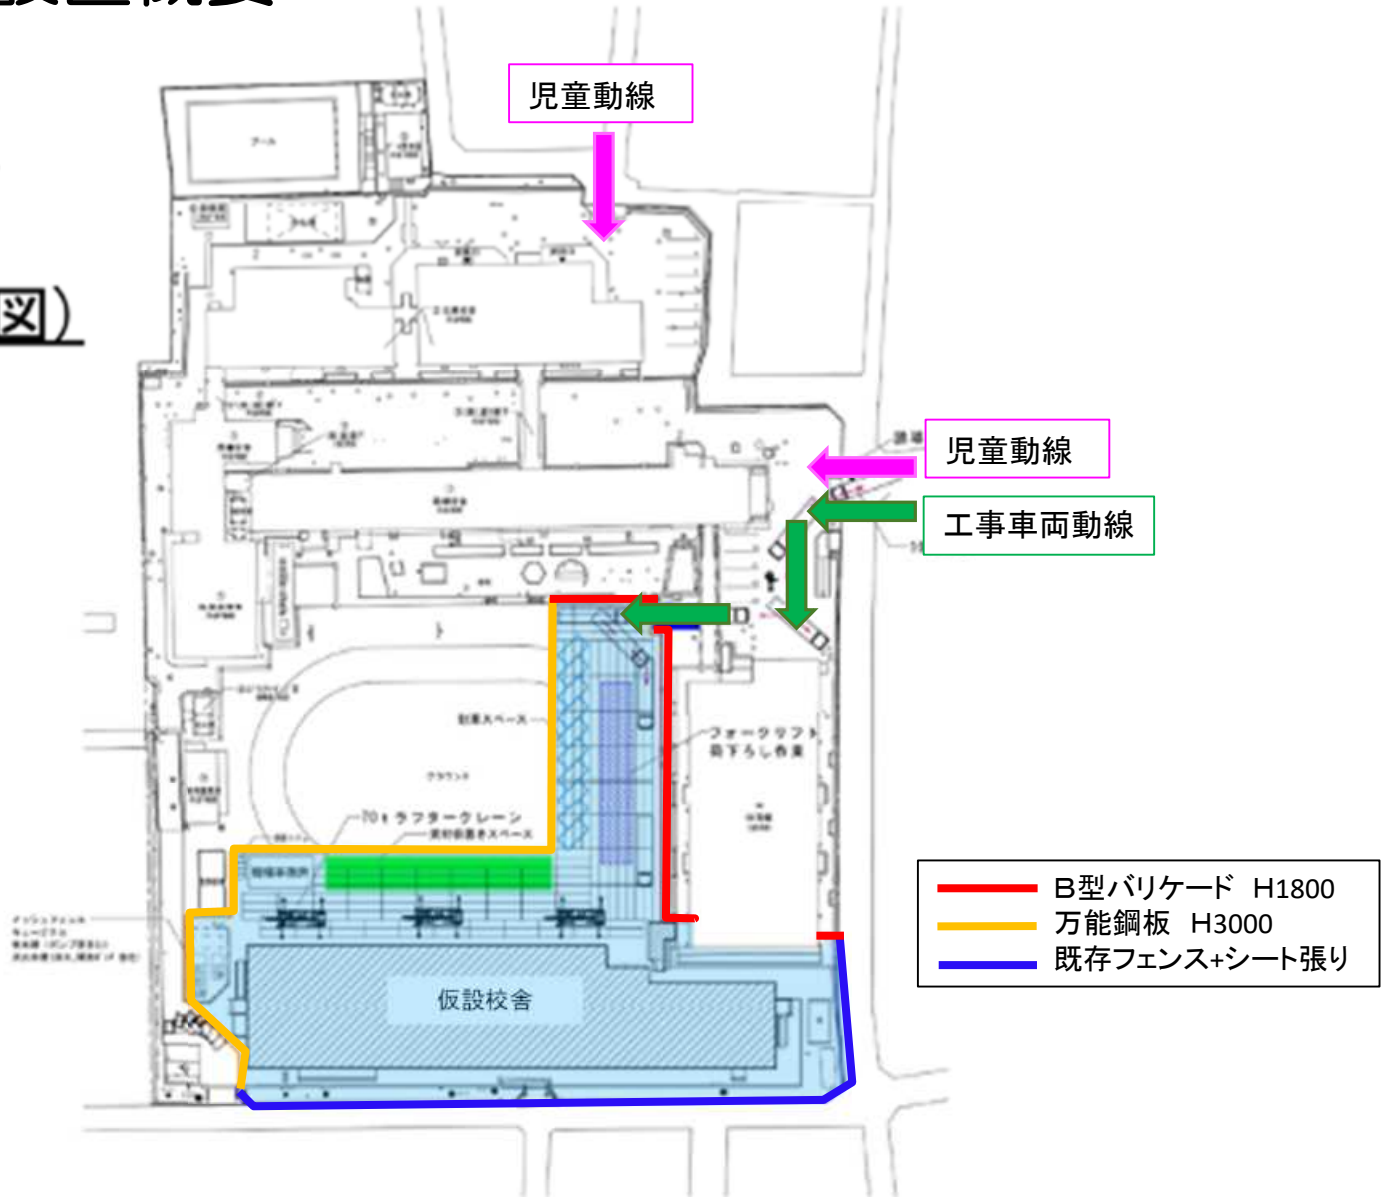

(2) 仮設校舎設置概要

配置図

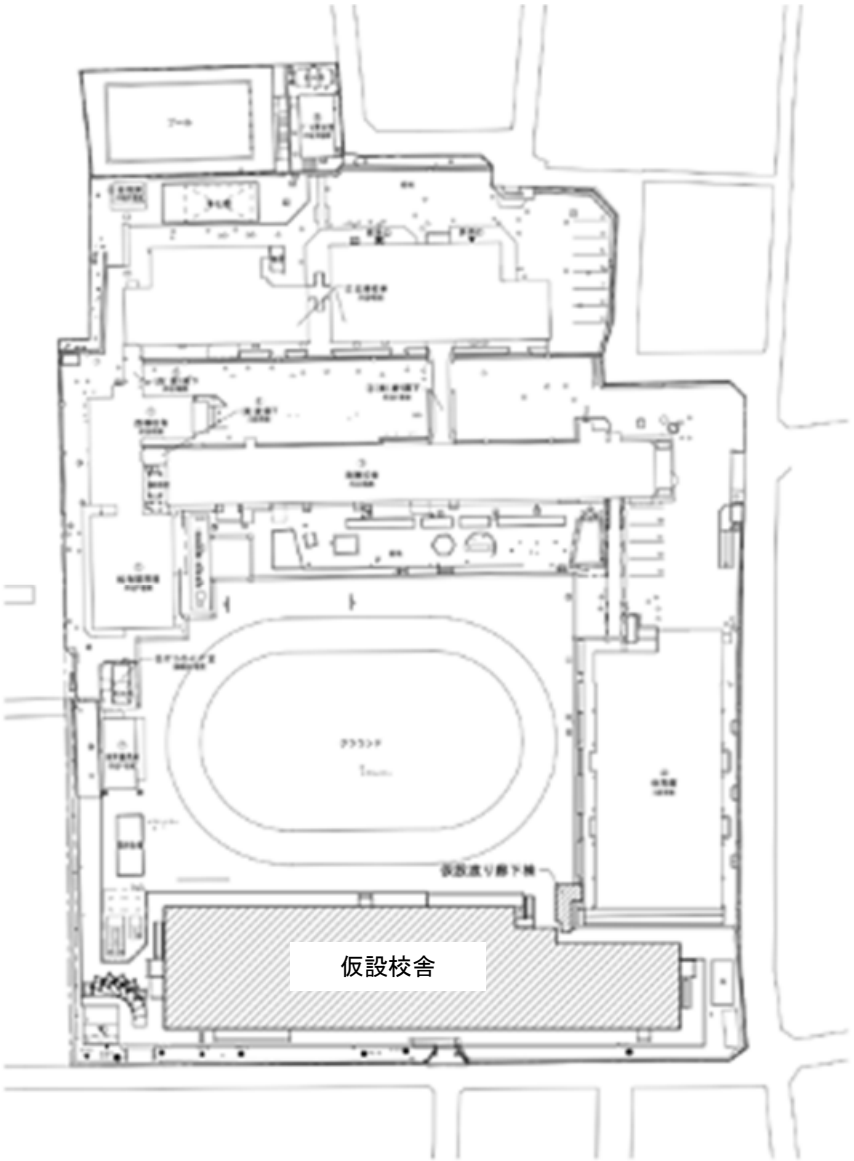

(2) 仮設校舎設置概要

平面図（1階）

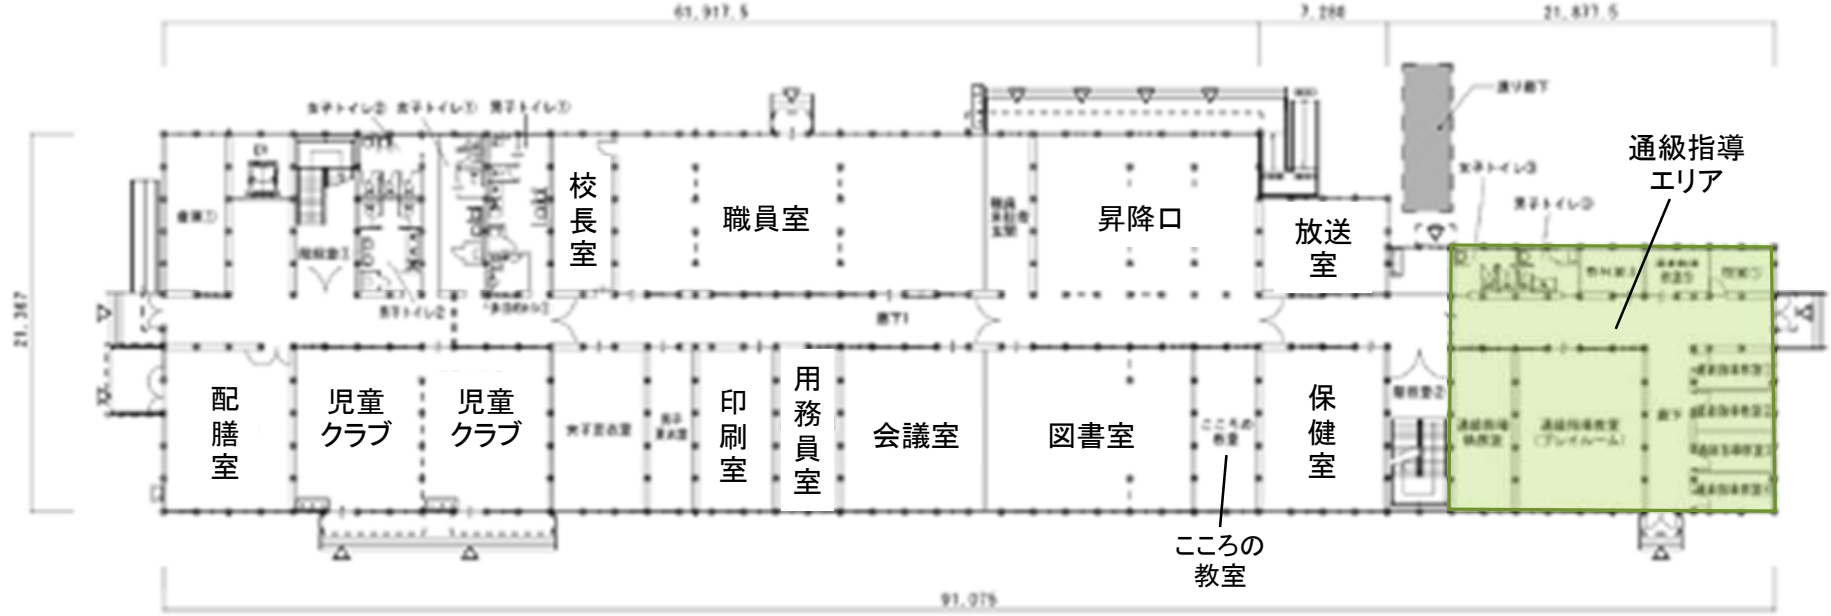

(2) 仮設校舎設置概要

平面図（2階）

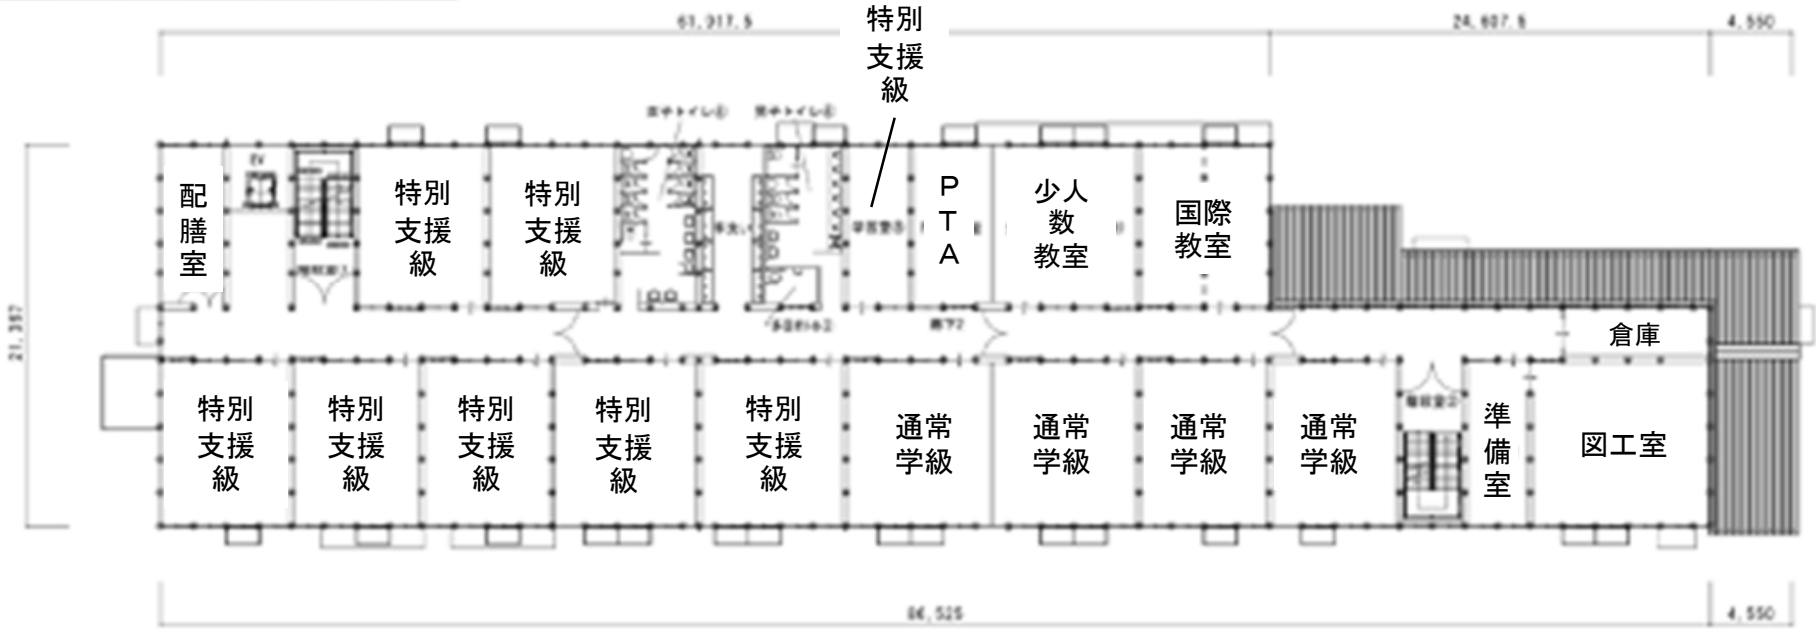

(2) 仮設校舎設置概要

平面図（3階）

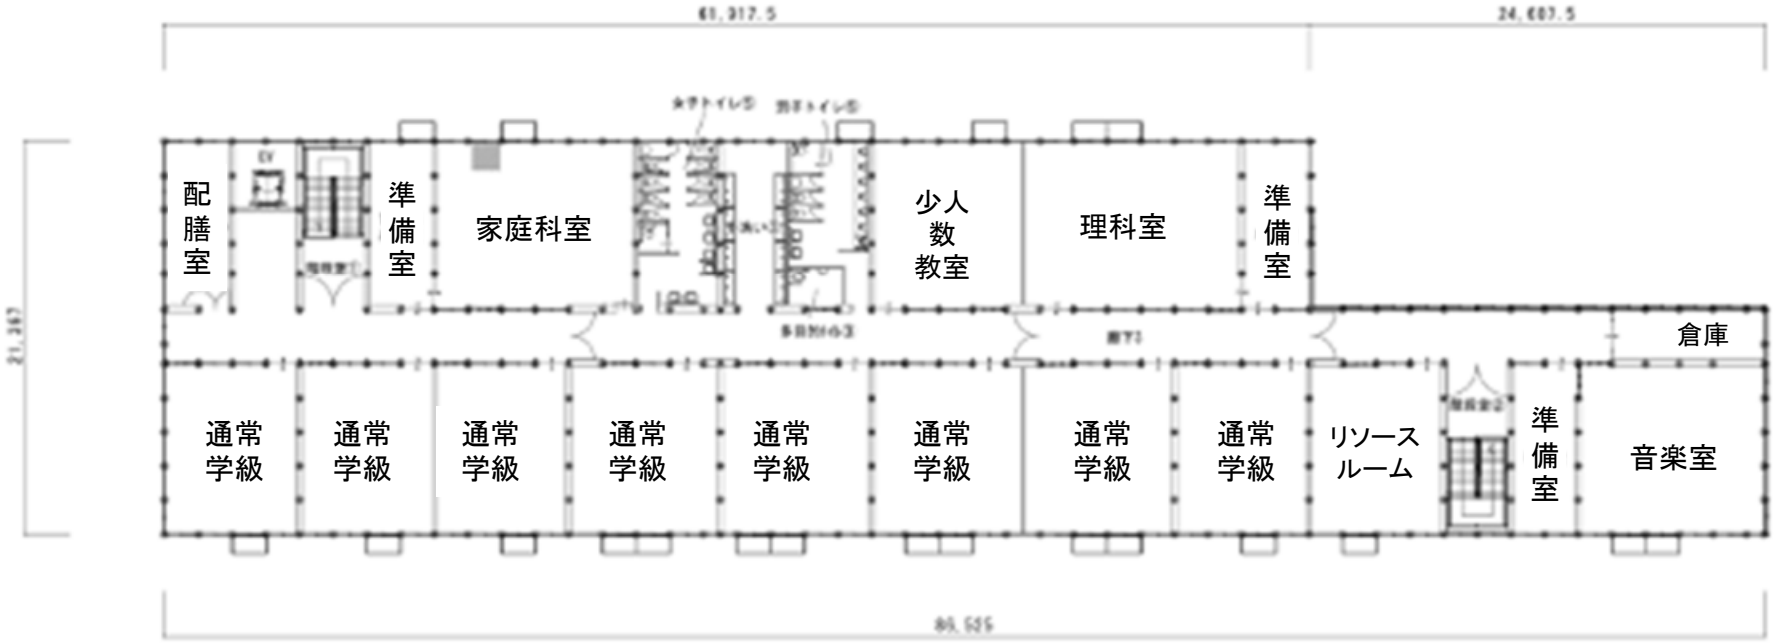

(2) 仮設校舎設置概要

立面図



南側立面図



北側立面図



西側立面図



東側立面図

(2) 仮設校舎設置概要

工事工程表

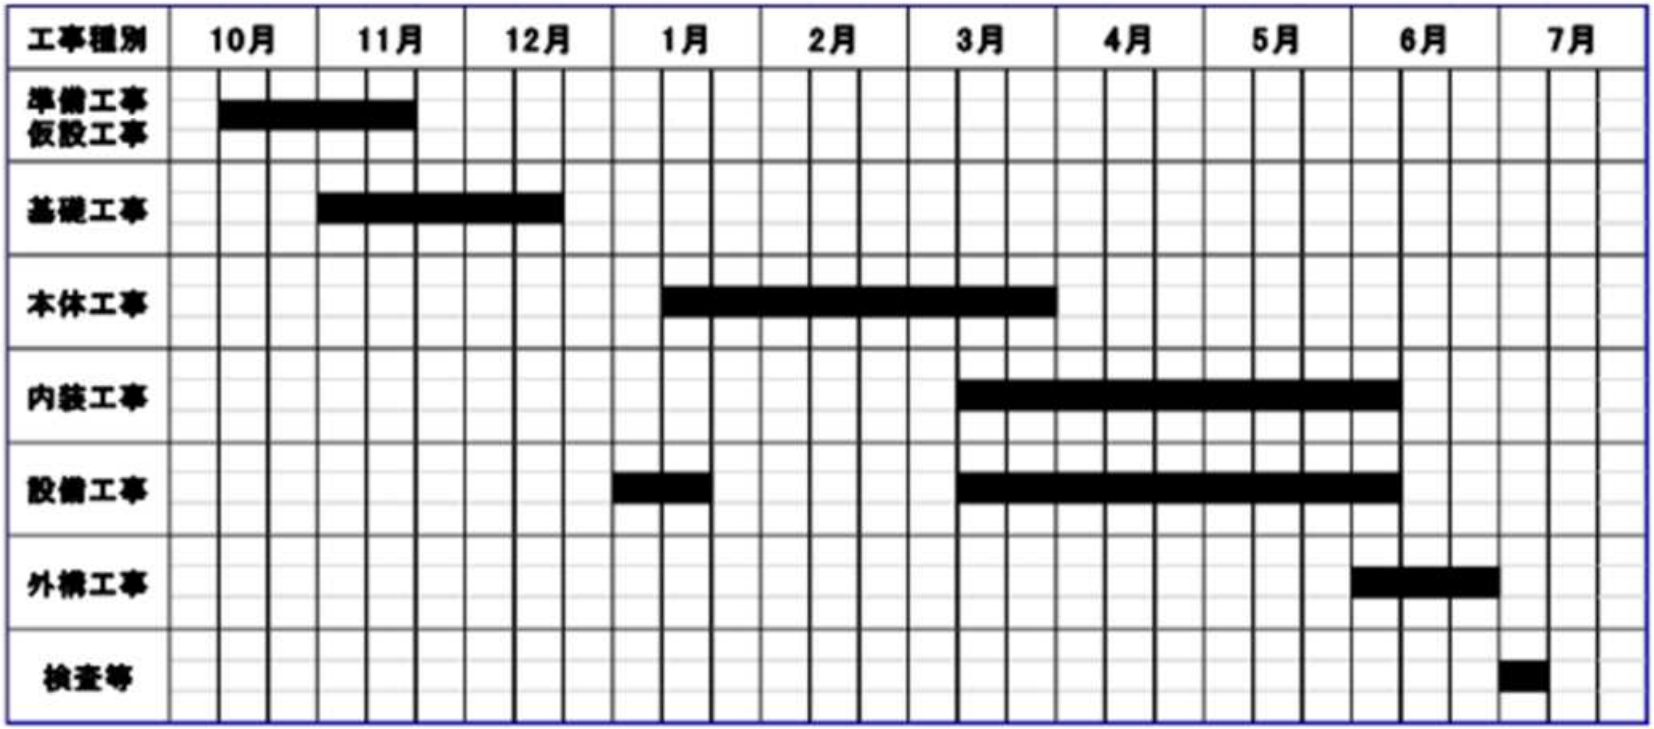

(2) 仮設校舎設置概要

工事期間中の近隣の方への配慮について

①作業時間は原則、午前8時半から午後5時までとします。
※準備や片づけは作業時間の前後で行います。

②原則、日曜日及び祝日は作業致しません。
※但し、騒音振動の発生しない軽微な作業については作業を行う場合があります。
※作業時間の延長及び日曜・祝日に作業をする場合は事前に連絡を致します。

③工事車両の出入口に誘導員を配置し事故の防止に万全を期します。

(2) 仮設校舎設置概要

④工事関係の車両は、路上駐車はせず工事現場内に
駐車します。

⑤工事中は低騒音・低振動の重機を使用し、騒音・振動に配慮
して作業を行います。

⑥工事中は週間のスケジュールを見やすい場所に
掲示致します。

問い合わせ先

厚木市教育委員会学校施設課計画整備係
電　　話　　046-225-2427（計画整備係直通）
メールアドレス　　7900@city.atsugi.kanagawa.jp

北小学校施設施設建て替え整備基本設計書

URL
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kosodate_kyoiku/sho_chugakko/5/5/kitashougakkou/47404.html
